

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Julio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	07/08/2018		
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007		
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008		
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008		
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008		
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,890,000.00	Meses de Prórroga	48		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,898,000.00	Plazo de ejecución	93.51%		
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	76.41%	Monto por desembolsar USD\$	3,760,736.14	23.59%

Gráfica de Ejecución

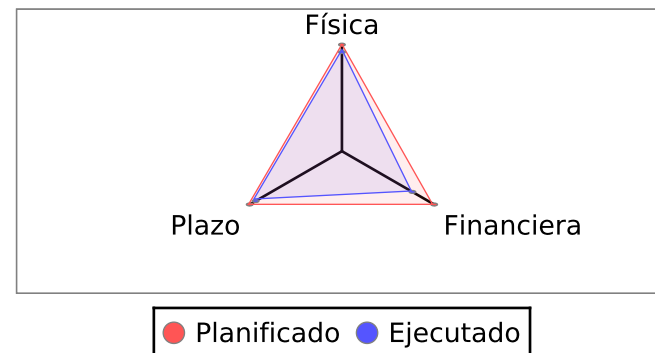

Tipo de cambio: 7.48 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	8,663,581.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	1,398,329.85	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	179.04% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	16.14%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	149.0845		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.	Unidad	1		1		0		2	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)	Unidad	1		0	1	0		1	1


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0		1	1	0		1	1
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1		2		0		3	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1		1	1	0		2	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos											
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		09/03/2018		15/03/2018	
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018		22/02/2018		28/02/2018		02/03/2018		09/03/2018	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018		05/02/2018		06/02/2018		08/02/2018		12/02/2018	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		08/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018		09/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		05/04/2018		10/04/2018		12/04/2018		16/04/2018	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018		19/03/2018		23/03/2018		27/03/2018		30/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		04/04/2018		09/04/2018		11/04/2018		13/04/2018	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

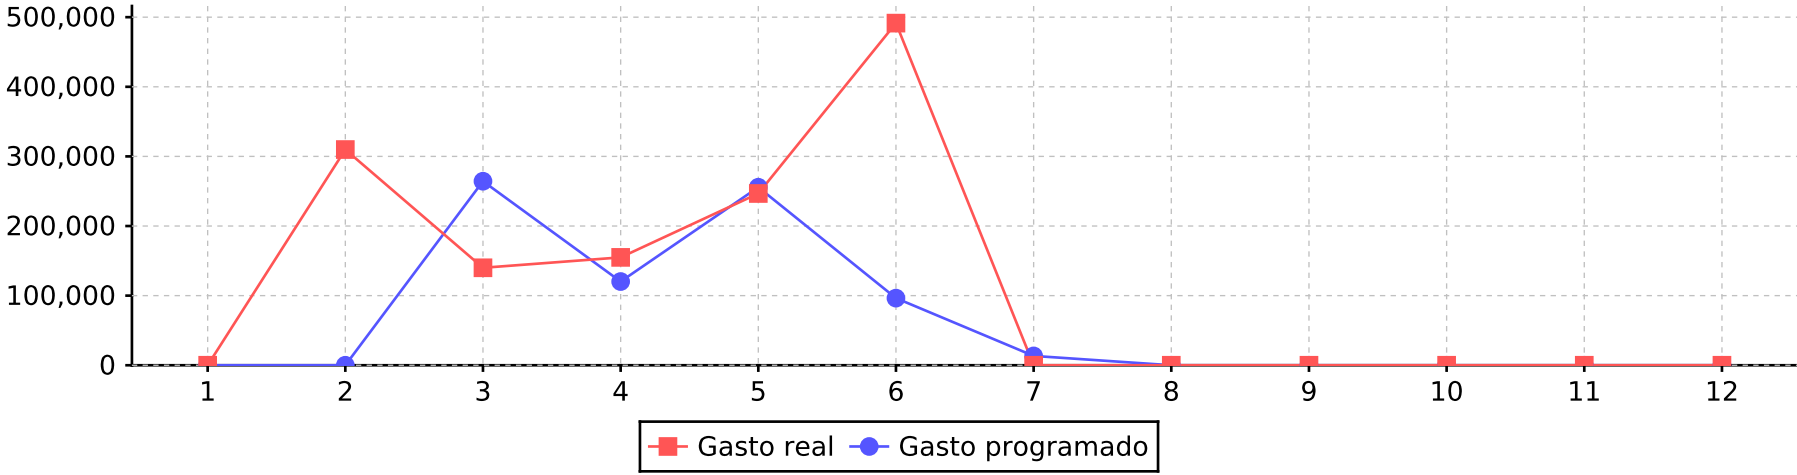

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	309,832.28	140,000.00	154,938.28	246,728.04	491,474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												1,342,972.69
Total Gasto programado												750,089.31

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

JULIO

²Ejercicio Fiscal


2018

³Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	09/07/2018	
⁵ Número de Préstamo					
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción

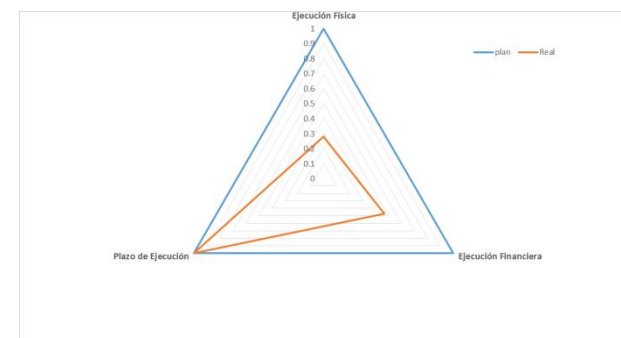

Con. Previas

Ejecución

Cierre



		Mensual		Anual		Total	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q . 15,610,759.82	Ejecución Financiera	47%	Ejecución Financiera	0.47
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.13,103,872.62	Ejecución Física de metas	0.32		
Presupuesto Devengado		Diferencia	Q.2,506,887.20	Plazo de ejecución actual	100		
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.0.00				
		Presupuesto planificado próximo	Q.0.00				

A1 METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -	Q 1,923,697.60	Q -		Q 3,378,750.00	Q 1,923,697.60
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	Q -
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -	Q 356,500.00	Q -		Q 1,334,000.00	Q 356,500.00
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -	Q 2,330,016.02	Q -		Q 2,547,666.22	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	Q -
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q 9,101,666.22	Q 4,610,213.62
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -	1082500	Q -		Q 2,006,107.60	Q 1,082,500.00
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	Q -
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -	158000			Q 203,000.00	Q 158,000.00
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -	900000	Q -		Q 1,750,000.00	Q 900,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -	6253159	Q -		Q 9,274,986.00	Q 6,253,159.00
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	Q -
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q 17,258,017.00	Q 8,393,659.00
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	Q -
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	Q -
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24					
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90	Q 10,000.00	Q -		Q 370,535.71	Q 10,000.00
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	Q -
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	Q -
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29	Q 90,000.00	Q -		Q 200,892.86	Q 90,000.00
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43	Q 90,000.00	Q -		Q 379,553.58	Q 90,000.00
TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33	Q 13,103,872.62	Q -		Q 27,919,596.51	Q 13,103,872.62	

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo agrícola	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados							Q -	Q 809,824.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,923,697.60		Q 1,455,052.40					Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 341,250.00					Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 356,500.00		Q 1,264,831.20					Q 1,621,331.20	Q 1,621,331.20
	Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,330,016.02		Q -					Q 2,330,016.02	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado								Q 1,500,000.00					Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,610,213.62	Q -	Q 4,561,133.60	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,171,347.22
SERVICIOS RURALES	Animal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,082,500.00		Q 1,110,857.60					Q 2,193,357.60	Q 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 198,631.00					Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola						Q 158,000.00		Q 273,000.00					Q 431,000.00	Q 431,000.00
	Huertos con macrotunel						Q 900,000.00		Q 890,892.40					Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,253,159.00		Q 3,021,827.00					Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos						Q -		Q 3,299,468.98					Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98
	SUBTOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,393,659.00	Q -	Q 8,794,676.98	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,188,335.98
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 62,500.02					Q 62,500.02	Q 62,500.02
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 75,892.86					Q 75,892.86	Q 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 80,357.14					Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00			Q 141,785.72				Q 151,785.72	Q 151,785.72
	SUBTOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q 360,535.74	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 370,535.74
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 31,339.70					Q 31,339.70	Q 31,339.70
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 66,964.29					Q 66,964.29	Q 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 80,356.72					Q 80,356.72	Q 80,356.72
	Informes		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00		Q 110,892.86					Q 200,892.86	Q 200,892.86
	SUBTOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -	Q 289,553.57	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.57
TOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,103,872.62	Q -	Q 14,815,723.89	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

A5 Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,103,872.82	Q -	Q 14,815,723.89	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												




7 Observaciones/Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.


8 Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR




Inq. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Mildred Melissa Esquivel Gravez
Asistente Técnico de Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones
Central, Noroccidente y Sureste



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 07 de Agosto de 2018.



Observaciones / Desafíos

El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Grávez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 7/8/2018 - 11:11 AM

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Julio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	07/08/2018		
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007		
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008		
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009		
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	82,280,000.00	Plazo de ejecución	98.74%		
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49	63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51	36.32%

Gráfica de Ejecución

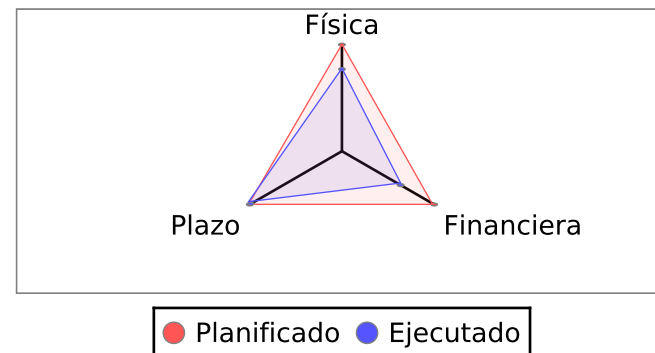

Tipo de cambio: 7.48 X 1 USD

