

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup> Mes reportado

Febrero

<sup>2</sup> Ejercicio Fiscal

2017

<sup>3</sup> Proyecto/Programa: Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

<sup>4</sup> Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-

<sup>5</sup> Número de Préstamo	FIDA No. 770-GT Donación FIDA No.1070-GT / OPEP No. 1414P	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	
<sup>6</sup> Código Presupuestario	11-02-003	<sup>14</sup> Fecha del decreto	02/12/2011
<sup>7</sup> Organismo Financiero	0405 - 0404	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	13/12/2011
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	11130012	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	02/12/2017
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	205	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	13/12/2011
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	DEG - USD	<sup>18</sup> Fecha de cierre	N/A
<sup>11</sup> Monto aprobado	FIDA 770-GT DEG 21,100,000 / Donación DEG 300,000 / OPEP USD 15,000,000	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	N/A
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	FIDA 770-GT Q 138,571,830 / Donación Q 3,469,500 / OPEP Q 115,650,000	<sup>20</sup> Plazo de ejecución	83.33%
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 770-GT 4,188,084.65 DONACION 100,000 OPEP 1,500,000	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	FIDA 770-GT 13,784,915.35 DONACION 350,000 OPEP 13,500,000
	770 GT 23.30% DONACION 22.22% OPEP 10%		770 GT 76.70% DONACION 77.78% OPEP 90%



<sup>23</sup> Suscripción



Ejecución



		Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	60,737,303.00	Desembolso planificado	0.00	Ejecución Financiera	0% / 100%	Ejecución Financiera	0.00 %
Presupuesto Vigente anual	60,737,303.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	5% / 100 %		
Presupuesto Devengado:	0.00	Diferencia	0.00	Plazo de ejecución actual	28 días		
% de Ejecución Presupuestaria	0%	Próximo desembolso del mes	750,000.00				
		Presupuesto planificado próximo	2,500,000.00				

#### A1 METAS AÑO FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente 1	315 letrinas	0	0	315	315	0	0	315	315
Componente 1	788 aljibes	788	788	0	0	0	0	788	788
Componente 1	315 letrinas	0	0	0	0	2500	2500	2500	2500
Componente 1	2 eventos formativos	0	0	1	1	1	1	2	2
Componente 1	Entrega de 590 becas ocupacionales	350	350	240	240	0	0	590	590
Componente 2	950 CADER se capacitan en sanidad animal	0	0	475	475	475	475	950	950
Componente 2	950 kits de medicinas como incentivo a promotores pecuarios	0	0	0	0	950	950	950	950
Componente 3	37 Planes de Negocios Formulados	20	20	17	17	0	0	37	37



COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente 3	3 Proyectos de infraestructura Productiva	0	0	3	3	0	0	3	3
Componente 3	15 Convenios de apoyo a la inversión productiva	10	10	5	5	0	0	15	15
Componente 3	40 Grupos capacitados para el Fomento al ahorro y Préstamo Comunitario	15	15	15	15	10	10	40	40
Componente 3	40 Grupos reciben Dotación de materiales para sus registros micro financieros	15	15	15	15	10	10	40	40
Componente 3	3 Ferias de Servicios Financieros	1	1	1	1	1	1	3	3
Componente 4	Kilómetros de carretera con mantenimiento	45.44	45.44	0	0	54	54	99.44	99.44
Componente 5	4 Eventos de capacitación institucional	0	0	1	1	0	0	1	1
Componente 5	1 Documento de línea base PRODENORTE actualizado	1	1	0	0	0	0	1	1
Componente 5	1 Documento de línea base RIMS PRODENORTE actualizado	1	1	0	0	0	0	1	1





## Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente 1	Licitación	315 letrinas	02/01/2017	06/02/2017	20/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	17/04/2017	5/05/2017	05/05/2017	15/05/2017	17/05/2017
Componente 1	Compra Directa	788 aljibes	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	12/01/2017	12/01/2017	06/02/2017	06/02/2017	20/03/2017	21/03/2017
Componente 1	Licitación	2500 estufas ahorradoras	15/02/2017	20/02/2017	20/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	17/04/2017	5/5/2017	8/5/2017	15/05/2017	17/05/2017
Componente 1	Compra Directa	2 eventos formativos	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 1	Compra Directa	Entrega de 590 becas ocupacionales INS	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 2	Compra Directa	950 CADER se capacitan en sanidad animal	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 2	Licitación	950 kits de medicinas como incentivo a promotores pecuarios	15/02/2017	20/02/2017	20/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	17/04/2017	5/5/2017	8/5/2017	15/05/2017	17/05/2017
Componente 3	Compra Directa	37 Planes de Negocios Formulados	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 3	Donación (convenio)	3 Proyectos de Infraestructura Productiva	02/05/2017	02/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	5/06/2017	5/06/2017	12/05/2017	12/05/2017
Componente 3	Donación (convenio)	15 Convenios de apoyo a la inversión productiva	02/05/2017	02/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	5/06/2017	5/06/2017	12/05/2017	12/05/2017
Componente 3	Compra Directa	40 Grupos capacitados para el Fomento al ahorro y Préstamo Comunitario	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 3	Compra Directa	40 Grupos reciben Dotación de materiales para sus registros micro financieros	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 3	Compra Directa	3 Ferias de Servicios Financieros	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017




Componente 4	Compra Directa	Kilómetros de carretera con mantenimiento	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	27/12/2016	27/12/2016	06/03/2017	13/03/2017
Componente 5	Compra Directa	4 Eventos de capacitación institucional	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 5	Compra Directa	1 Documento de línea base PRODENORTE actualizado	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
Componente 5	Compra Directa	1 Documento de línea base RIMS actualizado	20/03/2017	20/03/2017	03/04/2017	07/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017



### A3 Ejecución Financiera Anual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	750,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	3,800,000.00	4,500,000.00	2,900,000.00	6,300,000.00	3,400,000.00	4,500,000.00	3,800,000.00	8,300,000.00	49,250,000.00
Gasto programado	-	750,000.00	2,100,000.00	11,150,000.00	5,300,000.00	4,700,000.00	5,300,000.00	6,300,000.00	5,000,000.00	6,300,000.00	5,300,000.00	8,300,000.00	60,500,000.00

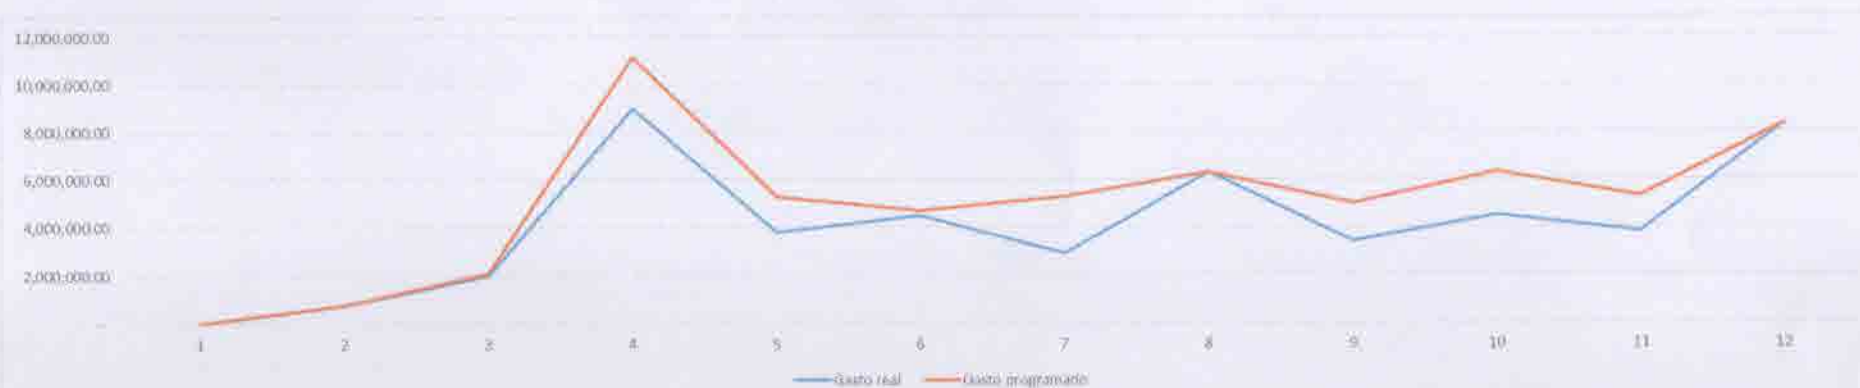

#### Proyección de desembolsos FIDA

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado				Q 6,100,794.99				Q 6,621,961.97			Q 6,361,378.49		Q 19,084,135.45
Realizado													
Variación													

#### Proyección de desembolsos OPEP

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado				Q 6,786,986.84					Q 8,397,616.58				Q 15,184,603.42
Realizado													
Variación													





## Plan de Ejecución de Programa

		Inicio	Finalización	Duración	Avance	Responsables	Presupuesto
	Objetivo	Fecha	Fecha	No. de Días	0%		
1	Componente 1: Desarrollo de Capital Humano y Social	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
	Producto 2 Eventos Formativos						
1.1	Formación de Formadores						Q 1,504,800.00
	Subactividades						
1.1.1	Formulación del proyecto	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	
1.1.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	4	0%	CFCHYS	
1.1.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.1.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	6	0%	CFCHYS	
1.1.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	28-feb-17	13	0%	CFCHYS	
1.1.6	Contratación del proveedor del servicio	28-feb-17	10-mar-17	10	0%	CFCHYS	
1.1.7	Ejecución del proyecto	11-mar-17	11-abr-17	30	0%	CFCHYS	
1.1.8	Informe final del proyecto	11-abr-17	14-abr-17	4	0%	CFCHYS	
	Producto 500 Becas Ocupacionales						
1.2	Capacitación a mujeres y jóvenes rurales						Q 1,722,000.00
	Subactividades						
1.2.1	Formulación del proyecto	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	
1.2.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	4	0%	CFCHYS	
1.2.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.2.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	6	0%	CFCHYS	
1.2.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	28-feb-17	13	0%	CFCHYS	
1.2.6	Contratación del proveedor del servicio	28-feb-17	10-mar-17	10	0%	CFCHYS	
1.2.7	Ejecución del proyecto	11-mar-17	11-abr-17	30	0%	CFCHYS	
1.2.8	Informe final del proyecto	11-abr-17	14-abr-17	4	0%	CFCHYS	



2	Componente 2: Producción Sostenible y Gestión de los Recursos Naturales	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
	Producto 950 Kit de medicinas entregados a CADER						
2.1	Incentivo a Promotores Pecuarios						Q. 345,000.00
	Subactividades						
2.1.1	Socialización del proyecto.	3-ene-17	28-abr-17	115	0%	CPSGRN	
2.1.2	Identificación y Capacitación de Organizaciones Comunitarias sobre Planes Profilácticos a Aves de Traspatio.	4-abr-17	29-sep-17	175	0%	CPSGRN	
2.1.3	Adquisición de Botiquines Pecuarios.	3-oct-17	30-nov-17	57	0%	CPSGRN	
2.1.4	Entrega de Botiquines Pecuarios.	3-oct-17	29-dic-17	86	0%	CPSGRN	
2.1.5	Asistencia Técnica en Salud y Profilaxis de aves de traspatio.	3-oct-17	29-dic-17	86	0%	CPSGRN	
2.1.6	Monitoreo de indicadores	6-nov-17	29-nov-17	53	0%	CPSGRN	
3	Componente 3: Acceso a Mercado y Servicios Financieros	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
	Producto 37 Planes de Negocio Formulados						
3.1	Formulación Participativa de planes de negocios						
	Subactividades						
3.1.1	Elaboración del perfil de proyecto.	8-ene-17	10-ene-17	2	0%	CAMYSF	
3.1.2	Revisión y/o retroalimentación de -Términos de referencia	11-ene-17	12-ene-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.3	Diagnostico participativo de las organizaciones. (Boleta)	15-ene-17	16-feb-17	32	0%	CAMYSF	
3.1.4	Grupo Focal Mixto de Diagnostico de Grupo para Plan de Negocios.	16-ene-17	16-feb-17	31	0%	CAMYSF	
3.1.5	Recolección y Análisis de la situación de la documentación de los grupos organizados.	16-ene-17	28-feb-17	43	0%	CAMYSF	
3.1.6	Elaboración del Plan de Negocios de la organización.	1-mar-17	30-abr-17	60	0%	CAMYSF	
3.1.7	Socialización del Plan de Negocios a la organización.	1-may-17	6-may-17	5	0%	CAMYSF	
3.1.8	Corrección de observaciones Plan de Negocios.	7-may-17	8-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.9	Presentación de Planes de Negocios a Comité Técnico	15-may-17	16-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.10	Impresión de plan de negocios para su no objeción.	17-may-17	18-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.11	Liquidación de Fondos	21-may-17	31-may-17	10	0%	CAMYSF	
	Producto 15 Convenios de Apoyo a la Inversión Productiva						
3.2	Inversión en diversas cadenas productivas						
	Subactividades						
3.2.1	Elaboración de perfil de proyecto.	1-feb-17	19-feb-17	18	0%	CAMYSF	





3.2.2	Elaboración de Términos de Referencia.	20-feb-17	22-feb-17	2	0%	CAMYSF	
3.2.3	Gestión Administrativa de fondos.	23-feb-17	30-mar-17	35	0%	CAMYSF	
3.2.4	Coordinación para la implementación de actividades productivas de acuerdo a perfiles elaborados	2-abr-17	22-jun-17	81	0%	CAMYSF	
3.2.5	Informe final y liquidación del proyecto	25-jun-17	29-jun-17	4	0%	CAMYSF	
	<b>Producto 40 Grupos Capacitados para el Fomento de ahorro y préstamo</b>						
3.3	<b>Fomento al ahorro y préstamo comunitario</b>						Q 130,000.00
	<b>Subactividades</b>						
3.3.1	Ingreso nuevos municipios para la implementación del Fomento al Ahorro Comunitario	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.2	Promoción para fomento al ahorro y préstamo comunitario en los municipios priorizados para el año en ejecución	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.3	Selección de promotoras voluntarios de los grupos de ahorro	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.4	Identificación del registro de usuarias	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.5	Gestión administrativa	1-mar-17	31-mar-17	30	0%	CAMYSF	
3.3.6	Primera capacitación a promotoras voluntarias	1-mar-17	30-abr-17	60	0%	CAMYSF	
3.3.7	Segunda capacitación a promotoras voluntarias	31-may-17	31-jul-17	61	0%	CAMYSF	
3.3.8	Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección	1-ago-17	31-oct-17	91	0%	CAMYSF	
3.3.9	Seguimiento a los grupos ya formados y funcionando	15-ene-17	15-dic-17	334	0%	CAMYSF	
	<b>Producto 40 Grupos reciben materiales para sus registros micro financieros</b>						
3.4	<b>Dotación de materiales para sus registros micro financieros</b>						Q 48,000.00
	<b>Subactividades</b>						
3.4.1	Gestión Administrativa de fondos.	1-mar-17	30-nov-17	274	0%	CAMYSF	
3.4.2	Coordinación para la implementación de actividades productivas de acuerdo a perfiles elaborados	1-mar-17	30-nov-17	274	0%	CAMYSF	
3.4.3	Informe final y liquidación del proyecto	1-mar-17	30-nov-17	274	0%	CAMYSF	
5	<b>Componente 5: Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>	<b>Coordinador Componente</b>	<b>Monto (Q)</b>
	<b>Producto 4 Eventos de capacitación institucional</b>						



5.1	Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.						Q 140,000.00
	<b>Subactividades</b>						
5.1.1	Formular el proyecto de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.	31-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.1.2	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	15-feb-17	28-feb-17	13	0%	CGPYFI	
5.1.3	Gestión Administrativa Financiera para la dotación de materiales e insumos	1-mar-17	30-mar-17	29	0%	CGPYFI	
5.1.4	Coordinación de Prodenorte con MAGA, Municipalidades y Organizaciones Productivas.	1-abr-17	31-ago-17	152	0%	CGPYFI	
5.1.5	Informe final y liquidación del proyecto	31-ago-17	30-sep-17	30	0%	CGPYFI	
	<b>Producto 1 Documento de línea base RIMS PRODENORTE actualizado</b>						
5.2	Actualización de Línea base de RIMS						Q 160,000.00
	<b>Subactividades</b>						
5.2.1	Elaboración de los términos de referencia	31-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.2.2	Gestión Administrativa Financiera para el proceso de contratación	15-feb-17	28-feb-17	13	0%	CGPYFI	
5.2.3	Presentación del plan de Trabajo con el Consultor	1-mar-17	4-mar-17	3	0%	CGPYFI	
5.2.4	Ejecución de la consultoría	5-mar-17	4-may-17	60	0%	CGPYFI	
5.2.5	Presentación del informe de línea base actualizado	4-may-17	10-may-17	6	0%	CGPYFI	
	<b>Producto 1 Documento de línea base PRODENORTE actualizado</b>						
5.3	Actualización de Línea Base Prodenorte						Q 50,000.00
	<b>Subactividades</b>						
5.3.1	Elaboración de los términos de referencia	31-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.3.2	Gestión Administrativa Financiera para el proceso de contratación	15-feb-17	28-feb-17	13	0%	CGPYFI	
5.3.3	Presentación del plan de Trabajo con el Consultor	1-mar-17	4-mar-17	3	0%	CGPYFI	
5.3.4	Ejecución de la consultoría	5-mar-17	4-may-17	60	0%	CGPYFI	
5.3.5	Presentación del informe de línea base actualizado	4-may-17	10-may-17	6	0%	CGPYFI	





## Plan de Ejecución de Programa

		Inicio	Finalización	Duración	Avance	Responsables	Presupuesto
	Objetivo	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
<b>1</b>	<b>Componente 1: Desarrollo de Capital Humano y Social</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>		
	<b>Producto 315 Letrinas implementadas</b>	Fecha	Fecha	No. de Días	0%		
<b>1.1</b>	<b>Actividad: Dotación de insumos para letrinas familiares</b>						
	<b>Subactividades</b>						
1.1.1	Formulación del proyecto de letrinas familiares	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	Q1,195,110.00
1.1.2	Priorización y listado de las comunidades sujetas a la intervención	30-ene-17	3-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.1.3	Identificación de usuarios y levantamiento de boleta para registro.	3-feb-17	15-feb-17	12	0%	CFCHYS	
1.1.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico (punto resolutivo del acta)	15-feb-17	17-feb-17	3	0%	CFCHYS	
1.1.5	Elaboración de especificaciones técnicas, generales y bases de licitación.	17-feb-17	24-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.1.6	Capacitación a los usuarios para el proyecto de letrina	24-feb-17	24-mar-17	30	0%	CFCHYS	
1.1.7	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	24-feb-17	24-may-17	90	0%	CFCHYS	
1.1.8	Adjudicación del proveedor de servicios	24-may-17	31-may-17	8	0%	CFCHYS	
1.1.9	Contratación del proveedor de servicio	31-may-17	1-jul-17	30	0%	CFCHYS	
1.1.10	Ejecución del proyecto	1-jul-17	26-jul-17	26	0%	CFCHYS	
1.1.11	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	26-jul-17	4-ago-17	10	0%	CFCHYS	
	<b>Producto 788 aljibes implementados</b>						
<b>1.2</b>	<b>Actividad: Dotación de Insumos para Aljibes</b>						
	<b>Subactividades</b>						
1.2.1	Formulación del proyecto de aljibes	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	Q3,851,949.00
1.2.2	Priorización y listado de las comunidades sujetas a la intervención	30-ene-17	3-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.2.3	Identificación de usuarios y levantamiento de boleta para registro.	3-feb-17	15-feb-17	12	0%	CFCHYS	
1.2.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico (punto resolutivo del acta)	15-feb-17	17-feb-17	3	0%	CFCHYS	
1.2.5	Elaboración de especificaciones técnicas, generales y bases de licitación.	17-feb-17	24-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.2.6	Capacitación a los usuarios para el proyecto de aljibes	24-mar-17	24-abr-17	30	0%	CFCHYS	





1.2.7	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	24-feb-17	24-may-17	90	0%	CFCHYS	
1.2.8	Adjudicación del proveedor de servicios	24-may-17	31-may-17	8	0%	CFCHYS	
1.2.9	Contratación del proveedor de servicio	31-may-17	1-jul-17	30	0%	CFCHYS	
1.2.10	Ejecución del proyecto de aljibes	1-jul-17	1-ago-17	26	0%	CFCHYS	
1.2.11	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	1-ago-17	8-ago-17	8	0%	CFCHYS	
	<b>Producto 2500 Estufas ahorradoras implementadas</b>						
1.3	<b>Actividad: Dotación de Insumos para Estufas Ahorradoras</b>						Q2,875,000.00
	<b>Subactividades</b>						
1.3.1	Formulación del proyecto de Estufas Ahorradoras	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	
1.3.2	Priorización y listado de las comunidades sujetas a la intervención	30-ene-17	3-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.3.3	Identificación de usuarios y levantamiento de boleta para registro.	3-feb-17	15-feb-17	12	0%	CFCHYS	
1.3.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico (punto resolutive del acta)	15-feb-17	17-feb-17	3	0%	CFCHYS	
1.3.5	Elaboración de especificaciones técnicas, generales y bases de licitación.	17-feb-17	24-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.3.6	Capacitación a los usuarios para el proyecto de Estufas Ahorradoras	24-abr-17	24-may-17	30	0%	CFCHYS	
1.3.7	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	24-feb-17	24-may-17	90	0%	CFCHYS	
1.3.8	Adjudicación del proveedor de servicios	24-may-17	31-may-17	8	0%	CFCHYS	
1.3.9	Contratación del proveedor de servicio	31-may-17	1-jul-17	30	0%	CFCHYS	
1.3.10	Ejecución del proyecto de construcción de estufas ahorradoras	1-jul-17	26-jul-17	26	0%	CFCHYS	
1.3.11	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	26-jul-17	4-ago-17	10	0%	CFCHYS	
4	<b>Componente 4: Caminos Rurales e Infraestructura Social</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>	<b>RESPONSABLE</b>	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.1	<b>Actividad: Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.</b>						Q 2,125,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.1.1	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.1.2	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.1.3	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.2	<b>Actividad: Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou, Semuy, Patate Icbolay y Lagunas del Faisan 1, Coban, Alta Verapáz.</b>						Q 2,920,000.00



	Subactividades						
4.2.1	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.2.2	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.2.3	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.3	<b>Actividad: Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche, Coban, Alta Verapaz.</b>						Q 1,850,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.3.1	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.3.2	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.3.3	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.4	<b>Actividad: Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc</b>						Q 425,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.4.1	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.4.2	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.4.3	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.5	<b>Actividad: Servicio de mejoramiento de Caminos Rurales del Municipio de San Juan Chamelco.</b>						Q 2,200,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.5.1	Informe de reconocimiento del tramo de carretera sujeto a mejoramiento para tránsito	15-ene-17	23-ene-17	9	0%	CCREIS	
4.5.2	Elaboración de estudios de factibilidad para el mejoramiento del tramo carretero	23-ene-17	15-feb-17	21	0%	CCREIS	
4.5.3	Elaboración del perfil de proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto.	15-feb-17	23-feb-17	8	0%	CCREIS	
4.5.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	23-feb-17	24-feb-17	2	0%	CCREIS	
4.5.5	Revisión de los expedientes por parte de FIDA para la No Objeción.	24-feb-17	28-feb-17	5	0%	CCREIS	
4.5.6	Firma del Convenio entre la Municipalidad y PRODENORTE	28-feb-17	17-mar-17	17	0%	CCREIS	
4.5.7	Capacitación a los usuarios del proyecto en la importancia del mantenimiento de carreteras	28-feb-17	28-mar-17	30	0%	CCREIS	
4.5.8	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	28-feb-17	28-may-17	90	0%	CCREIS	
4.5.9	Adjudicación del proveedor de servicios	28-may-17	5-jun-17	9	0%	CCREIS	





4.5.10	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.5.11	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.5.12	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.6	<b>Actividad: Servicios de Mejoramiento de Caminos Rurales San Miguel Tukurú</b>						Q 1,000,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.6.1	Informe de reconocimiento del tramo de carretera sujeto a mejoramiento para tránsito	15-ene-17	23-ene-17	9	0%	CCREIS	
4.6.2	Elaboración de estudios de factibilidad para el mejoramiento del tramo carretero	23-ene-17	15-feb-17	21	0%	CCREIS	
4.6.3	Elaboración del perfil de proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto.	15-feb-17	23-feb-17	8	0%	CCREIS	
4.6.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	23-feb-17	24-feb-17	2	0%	CCREIS	
4.6.5	Revisión de los expedientes por parte de FIDA para la No Objeción.	24-feb-17	28-feb-17	5	0%	CCREIS	
4.6.6	Firma del Convenio entre la Municipalidad y PRODENORTE	28-feb-17	17-mar-17	17	0%	CCREIS	
4.6.7	Capacitación a los usuarios del proyecto en la importancia del mantenimiento de carreteras	28-feb-17	28-mar-17	30	0%	CCREIS	
4.6.8	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	28-feb-17	28-may-17	90	0%	CCREIS	
4.6.9	Adjudicación del proveedor de servicios	28-may-17	5-jun-17	9	0%	CCREIS	
4.6.10	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.6.11	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.6.12	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.7	<b>Actividad: Servicios de Mejoramiento de Camino Rurales del municipio de San Antonio Senahú</b>						Q 1,200,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.7.1	Informe de reconocimiento del tramo de carretera sujeto a mejoramiento para tránsito	15-ene-17	23-ene-17	9	0%	CCREIS	
4.7.2	Elaboración de estudios de factibilidad para el mejoramiento del tramo carretero	23-ene-17	15-feb-17	21	0%	CCREIS	
4.7.3	Elaboración del perfil de proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto.	15-feb-17	23-feb-17	8	0%	CCREIS	
4.7.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	23-feb-17	24-feb-17	2	0%	CCREIS	
4.7.5	Revisión de los expedientes por parte de FIDA para la No Objeción.	24-feb-17	28-feb-17	5	0%	CCREIS	
4.7.6	Firma del Convenio entre la Municipalidad y PRODENORTE	28-feb-17	17-mar-17	17	0%	CCREIS	
4.7.7	Capacitación a los usuarios del proyecto en la importancia del mantenimiento de carreteras	28-feb-17	28-mar-17	30	0%	CCREIS	





4.7.8	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	28-feb-17	28-may-17	90	0%	CCREIS	
4.7.9	Adjudicación del proveedor de servicios	28-may-17	5-jun-17	9	0%	CCREIS	
4.7.10	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.7.11	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.7.12	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.8	<b>Actividad: Servicios de Mejoramiento Camino Rurales del Municipio de Raxruhá</b>						Q 2,000,000.00
	<b>Subactividades</b>						
4.8.1	Informe de reconocimiento del tramo de carretera sujeto a mejoramiento para tránsito	15-ene-17	23-ene-17	9	0%	CCREIS	
4.8.2	Elaboración de estudios de factibilidad para el mejoramiento del tramo carretero	23-ene-17	15-feb-17	21	0%	CCREIS	
4.8.3	Elaboración del perfil de proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto.	15-feb-17	23-feb-17	8	0%	CCREIS	
4.8.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	23-feb-17	24-feb-17	2	0%	CCREIS	
4.8.5	Revisión de los expedientes por parte de FIDA para la No Objeción.	24-feb-17	28-feb-17	5	0%	CCREIS	
4.8.6	Firma del Convenio entre la Municipalidad y PRODENORTE	28-feb-17	17-mar-17	17	0%	CCREIS	
4.8.7	Capacitación a los usuarios del proyecto en la importancia del mantenimiento de carreteras	28-feb-17	28-mar-17	30	0%	CCREIS	
4.8.8	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	28-feb-17	28-may-17	90	0%	CCREIS	
4.8.9	Adjudicación del proveedor de servicios	28-may-17	5-jun-17	9	0%	CCREIS	
4.8.10	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.8.11	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.8.12	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	
	<b>Producto Kilómetros de carretera con mantenimiento</b>						
4.9	<b>Actividad: Servicios de Mejoramiento Camino Rurales del Municipio de Chisec</b>						Q 2,098,400.00
	<b>Subactividades</b>						
4.9.1	Informe de reconocimiento del tramo de carretera sujeto a mejoramiento para tránsito	15-ene-17	23-ene-17	9	0%	CCREIS	
4.9.2	Elaboración de estudios de factibilidad para el mejoramiento del tramo carretero	23-ene-17	15-feb-17	21	0%	CCREIS	
4.9.3	Elaboración del perfil de proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto.	15-feb-17	23-feb-17	8	0%	CCREIS	
4.9.4	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	23-feb-17	24-feb-17	2	0%	CCREIS	
4.9.5	Revisión de los expedientes por parte de FIDA para la No Objeción.	24-feb-17	28-feb-17	5	0%	CCREIS	



4.9.6	Firma del Convenio entre la Municipalidad y PRODENORTE	28-feb-17	17-mar-17	17	0%	CCREIS	
4.9.7	Capacitación a los usuarios del proyecto en la importancia del mantenimiento de carreteras	28-feb-17	28-mar-17	30	0%	CCREIS	
4.9.8	Desarrollo de la Gestión Administrativa para contratación del servicio (portal Guatecompras)	28-feb-17	28-may-17	90	0%	CCREIS	
4.9.9	Adjudicación del proveedor de servicios	28-may-17	5-jun-17	9	0%	CCREIS	
4.9.10	Contratación del proveedor de servicio	5-jun-17	23-jun-17	18	0%	CCREIS	
4.9.11	Ejecución del proyecto de Mejoramiento de Carretera	23-jun-17	23-sep-17	90	0%	CCREIS	
4.9.12	Informe de ejecución y plan de acción para el monitoreo del uso adecuado.	23-sep-17	23-oct-17	30	0%	CCREIS	



<sup>A7</sup> Observaciones/Desafíos

El presupuesto deberá ser asignado al programa en el mes de febrero para poder operativizar las intervenciones planteadas en el Plan Operativo tanto de los fondos FIDA como de OPEP y la Donación FIDA.


Durante la ejecución del 2017 será necesario establecer los controles adecuados para lograr los resultados esperados.

Los recursos humanos y materiales deberán estar en tiempo previsto para lograr la operación esperada

<sup>A8</sup> Riesgos:

El cumplimiento de la operación depende de que los desembolsos puedan ser efectivos en el tiempo establecido

Elaborado por: Ing. José Antonio López Leonardo



Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía



**MV José Felipe Orellana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización: 31 de enero de 2017
