

ARCHIVO 2

Inciso g) del Artículo 17 Ter del Decreto 13-2013,
Avance físico-financiero de los proyectos financiados
con recursos externos

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-1461- 2018/hv del 14 de octubre de 2018	Informe de ejecución física/financiera del Programa de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororoiente y Suroriente y Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- de mes de octubre de 2018 -FIDA Oriente y FIDA Prodenorte-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000




GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

2018-92105

Ref. 71988



15 NOV 2018

13-53

13

Ref. Oficio No. DCPF-1641-2018/hv
Guatemala, 14 de octubre de 2018



UDAF CENTRAL	
-MAGA-	
Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **octubre de 2018** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.


Atentamente,



Inga. Melinda Lucía, Jefe del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y
Fideicomisos
MAGA



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio MAGA Nivel 3, PBX: 2413 7000 Ext. 7230

www.maga.gob.gt

Seguimos en



Guatemala, 12 de noviembre del 2018
Oficio-DFO-2018-11-787

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid


Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de octubre de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,



Ing. Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.75	100%	00.00	00.00	00.00	0%	Se lleva el 75% de avance físico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016 y se finalizó en el 2017
		Equipamiento	1	1	0.75						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasagastán, El Progreso	Metros Cuadradas	640	640	640	100%	00.00	00.00	00.00	0%	Desembolso otorgado 2016 se emite aprobación para compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	7						

Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODES, aldeas Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Equipamiento	249	249	0	0%	Q880,990.32	Q880,990.32	Q880,990.32	100%	Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Acción complementaria de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apalnos para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-	Equipamiento	1055	1015	1015	100%	Q1,805,525.70	Q1,805,525.70	Q1,805,525.70	100%	Se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1600	1600	600	34%	Q8,099,400.00	Q4,054,167.60	Q4,054,167.60	100%	Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto debido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de Gasto 483. Se entrega el desembolso para la ejecución del proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	1575						Se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del primer desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución del Proyecto.
		Equipamiento	1	1	43	59%	Q6,036,345.00	Q6,036,346.00	Q3,018,173.00	50%	
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Proceso Administrativo	7	7	7						
		Hectáreas	500	500	300	93%	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	100%	Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del segundo desembolso con fondos OFID para finalizar la ejecución del Proyecto.
TOTALES			7	7	7	69%	Q20,057,248.02	Q16,022,015.62	Q13,003,842.62	64%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Base	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
RECuento comparativo			
Ejecución Física	Ejecución Financiera		
	64%	Variación % Física	0%
IV.2 GESTIÓN AL MES			
	Ejecución Física	Variación % Financiera	0%
69%	Ejecución Financiera		
	64%		
		IV.3 Alertivos	
		Se realizó reintegro de una parte del saldo de la cuenta secundaria OPEP 1182P 11298160049. Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298160049 de OFID 1182P	

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2015 y 2017


 Ing. María del Rosario Flores
 Sub-Directora Técnica
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiente y Suroriente




 M.V. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

M.V. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
OCTUBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO


II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Vigente		Ejecutado	% Ejecución	Vigente		Ejecutado	% Ejecución	
			Inicial				Inicial				
Unidad de Coordinación del Programa	Contratación del Personal OBI	Servicios	6	6	6	100%	Q826,552.26	Q851,930.54	Q869,530.96	97%	Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal OBI. Se le asigna al proceso administrativo el 25% del avance físico. El avance financiero llega al 97% por baja en nómina del personal.
		Proceso Administrativo	16	22	22						
TOTALES											
						100%	Q826,552.26	Q851,930.54	Q869,530.96	97%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Avance del mes										
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias		
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Base	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna		
Componente 1, 2, 3 y 4	Contratos del plan de cierre	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente de contrato	Ninguna		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance			
El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, el cierre se efectuó con fecha 30 de junio de 2018. La variación física y la variación financiera ya no presentan movimientos con relación al mes anterior.			
Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298150050 de FIDA 651-GT			


Firma Elaborado Por

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental


Firma Aprobado Por



MV José Felipe Orellana Mejía
Vice Ministro de Desarrollo
Económico Rural

Ref. Oficio -PRODENORTE-AF-LC-ag-645-2018
Guatemala, 12 de noviembre de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sírvase encontrar los informes del Avance Físico Financiero de **FIDA 770-GT** y **OPEP-1414P** correspondiente al mes de octubre 2018, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -**PRODENORTE**-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c. archivo

16 calle 15-49, zona 13. Ciudad Guatemala.

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



NOTA DE TRASLADO No. 354-2018

Para: MV Jose Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural
-MAGA-

De: Licda. María Liceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
-PRODENORTE-

Fecha: Guatemala, 07 de noviembre de 2018.

Documentos: INFORMES DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y
DESEMPEÑO DE PRÉSTAMOS

No.	Concepto	Observaciones
1	Se adjuntan Informes de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos de (FIDA 770-GT) y (OPEP 1414P), correspondiente al mes de octubre 2018.	Para Firma del Señor Viceministro.

Recibido:

12 NOV 2018
16:20 A. Córdova

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

RECIBIDO
35483
07 NOV 2018

HORA: 15:49 POR: Olma

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Resultado											
I. Datos Generales											
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 100-97 y sus reformas (Dto. 13-2015) los recursos de las Entidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma y Empresas Públicas, incorporadas de la ejecución de los programas y proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (prestatos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como donadora, generadora o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera, para prestatos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.											
Artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Mado, Q.04.340-2013 Informes de Avance Físico y Financiero.											
Se incorpora un segmento de indicadores eliminado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 100-97.											
Código Presupuestario: 405.306											
II. Avance Físico y Financiero											
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Índice	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Total	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Promotores	140	140	0	0.00%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Liderazgo y empoderamiento de Autorías para las Mujeres, Grupos e Interculturalidad	Mujeres	100	100	0	0.00%	Q243,100.00	Q243,100.00	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Capacitación de Lectores y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de OACEN de Abasco Comunitario	Mujeres	300	300	0	0.00%	Q236,800.00	Q236,800.00	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	38	38	0	0.00%	Q212,401.48	Q212,401.48	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer (DMJM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q230,000.00	Q230,000.00	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.
	Capacitación en la Metodología de Abono y Prestamo Comunitario	Mujeres	289	289	0	0.00%	Q213,384.00	Q213,384.00	Q200	0.00%	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q20,000.00	Q20,000.00	Q200	0.00%	Acta Gráfico y documento final
	Concepción de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhán, Chisec, Barahona y Sochob	Viveros	5	5	0	0.00%	Q210,000.00	Q210,000.00	Q200	0.00%	Actas de Entrega
	Fortalecimiento de la producción agrícola de Trucapán, creación de botiquines, asistencia a CACEN, atención en planes de negocio de cuencas y áreas productivas	Botiquines	370	370	0	0.00%	Q235,000.00	Q235,000.00	Q200	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
	Concepción Material para actividades Microfinanciera	Convenios	26	26	10	38.46%	Q23,834,348.33	Q23,834,348.33	Q200	0.00%	Convenio firmados.
Producción Sostenible y Gestión de Recursos Naturales	Concepción Material para actividades Microfinanciera	Mts	30	30	0	0.00%	Q20,000.00	Q20,000.00	Q200	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales
	Fomento al Abono y Cultura Financiera (Anillos, videos, casillas, formación a los CACEN de Abasco y Prestamo Comunitario)	Eventos	4	4	0	0.00%	Q24,800.00	Q24,800.00	Q200	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega
	Financiamiento (realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros) Agropecuarias y de Servicios Financieros	Eventos	2	2	0	0.00%	Q24,800.00	Q24,800.00	Q200	0.00%	Convenio firmados
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	104	104	102	98.08%	Q2,442,400.00	Q2,442,400.00	Q210,100.00	8.33%	Informes periódicos de la acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
			1,746	1,746	111	6.31%	Q24,390,034.31	Q24,390,034.31	Q210,100.00	0.64%	
III. Resultados Presupuestarios del Programa (Procesos)											
Avance de Mes											
II.1 Componente al que se vincula			II.2 Avance Físico al Mes			II.3 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			No. de personas capacitadas/No. de personas planificadas	Índice	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.			
II.1 Componente al que se vincula			Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar		1.00	1.00	0.00	Uso de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	II.1 Componente al que se vincula		

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

1. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Octubre
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
	DOTACIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	Q6,750,000.00	Q6,750,000.00	Q0.00	0%	Actas de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Purulhú, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Imaha, Camcel, Sacate y Xelciza	Km	15.32	15.32	15.32	1	Q850,000.00	Q850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Leal, Baha Tán, La Sultana, Sacoyu, Samuy, Parate y Cololay Las Leguas del Pájol	Km	19.2	19.2	19.2	1	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	Q0.00		Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
	Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidembas Cuatro Centro Panchisvie, del Municipio de Purulhú, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entada a Pental, Guachaván y Cruce Caserio Sachos, del Municipio de Purulhú, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldas de Santa Catalina Chajonab, Santo Tomás Chajonab y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldas Sotol y Chirens, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldas de Patak, Sacatón, Chajonab y Santa Cecilia Chajonab, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz".	Km	29.32	29.32	0	0	Q9,308,973.44	Q9,308,973.44	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
Caminos e Infraestructura social	Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Alda de Sequit, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Limón, Nuevo Sinal, San Pedro Limón y Caserio Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Alda San Miguel Sedochoc, del Municipio de Raxruhá, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldas Yabachet, Palastina, Gaxaman y las Papayen, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz".	Km	36.66	36.66	0	0	Q9,191,808.00	Q9,191,808.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Km	29.19	-29.19	0	0	07.278.384.00	00.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
		1.000	1	0	0	09.275.180.67	00.00	0%	Comentarios firmados.
Total		130	129	34.52	25.66%	043.872.346.11	00.00	0%	

III. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la planificación del proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación para firma de convenio con las municipalidades.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	

BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

1. GESTIÓN MES ANTERIOR

Ejecución Física	Ejecución Financiera
1%	3%

No se reporta avance físico-financiero, debido a que las modificaciones presupuestarias están en proceso.

IV.2 Valoración Balance

IV.2 GESTIÓN AL MES	Ejecución Física	Ejecución Financiera
27%	3%	0%

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborada Por

Licda. María Lisseth Latorre Zelaya

Subdirectora Administrativa Financiera

MACA-PRODENORTE

Firma Aprobada Por

Licda. Gabriela Herrera G.

DIRECTORA EJECUTIVA

MACA-PRODENORTE

Firma Aprobada Por

MV José Felipe Orellana Mejía

Viceministro

MACA-PRODENORTE



AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Ref. Oficio No. DCPF-1641-2018/hv	No. de Referencia:	71988
Usuario que envía: Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe: Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción: 21/11/2018 10:17 a.m.	Folios:	13
Asunto:	Se envía el Informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de octubre 2018.	

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
☐ Christian Fernando Rodas Flores
☒ Hulda Priscila Castellanos
☐ Juan Esteban Ordóñez González
☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
☐ María Luisa Hernández Giron
☐ Melvin Ivan Polanco Donado
☐ Selvin Arnoldo Mérida
☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
☐ Asistir
☐ Atender lo solicitado
☐ Emita Opinión
☐ Informe sobre el particular
☐ No procede lo solicitado
☐ Otros: _____
☐ Para su estudio y dictamen
☐ Procédase como se solicita
☐ Responder
☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

F.

Selvin Arnoldo Mérida G.
JEFE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-1423- 2018/hv del 16 de octubre de 2018	Informe de ejecución física/financiera del Programa de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororoiente y Suroriente y Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- de mes de septiembre de 2018 - FIDA Oriente y FIDA Prodenorte-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000



Ref. 68147

30000000 052
UDAF CENTRAL
-MAGA-

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Ref. Oficio No. DCPF-1423-2018/hv

Guatemala, 16 de octubre de 2018

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19



2018-83750

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **septiembre de 2018** de los siguientes programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.


Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,



Inga. Melinda [Firma] [Firma]
Directora de Cooperación y Fideicomisos



Llida, Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Llida, Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo


7^a. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 416; PBX: 2413 7000 Ext. 7295 y 7230

www.maga.gob.gt

Seguinos: [Facebook] [Twitter] [Instagram] [YouTube]

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Jalapa 15.04



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 15 de octubre del 2018
Oficio-DFO-2018-10-751

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

www.magda.gob.gt



Plan Anual de Ejecución

Mes reportado


Septiembre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Numero de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	08/10/2018	
Codigo Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007	
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008	
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008	
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008	
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017	
Monto Entidad Ejecutora Dólares	15,890,000.00	Meses de Prorroga	48	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	87,395,000.00	Plazo de ejecución	93.51%	
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	76.94%	3,651,549.14	23.06%

Gráfica de Ejecución

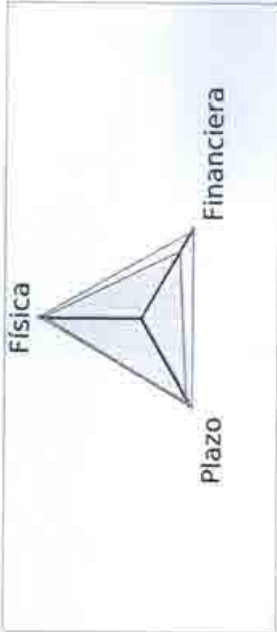

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

000000000 050

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	8,663,581.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	1,488,128.96	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	198.39% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	17.18%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	149.0845		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiental y Suroriental; PNDR ORIENTE.	Unidad	1		1		0		2	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)	Unidad	1		0	1	0		1	1

Producto	Unidad de medida	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0		1	1	0		1	1
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1		2		0		3	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1		1	1	0		2	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Presentación de documentos		Lanzamiento de evento		Revisión y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos											
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiental y Suroriental; PNDR ORIENTE.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		09/03/2018		15/03/2018	
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018		22/02/2018		28/02/2018		02/03/2018		09/03/2018	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018		05/02/2018		06/02/2018		08/02/2018		12/02/2018	
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		08/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018		09/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018


Adquisición	Método	Preparación de documentos		Fianciamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Partida de destino	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018
Desembolso para el contrato	Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato	Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		05/04/2018		10/04/2018		12/04/2018		16/04/2018	
Desembolso para el contrato	Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018		19/03/2018		23/03/2018		27/03/2018		30/03/2018	
Desembolso para el contrato	Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.										
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		04/04/2018		09/04/2018		11/04/2018		13/04/2018	

Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos													
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiental y Sureste; PNDR ORIENTE.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales	0.00	0.00	15,669.54	0.00	15,669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,339.28
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	37,946.43	0.00	37,946.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.86
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	26,785.72	0.00	0.00	26,785.72	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,964.30
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	40,178.57	13,392.86	13,392.86	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,357.15
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	32,142.86	16,071.43	16,071.43	16,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,357.15
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente:													
Total	0.00	0.00	80,357.14	120,357.14	155,692.41	95,692.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total	0.00	0.00	160,714.28	160,714.28	311,384.81	191,385.14	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,601.37

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

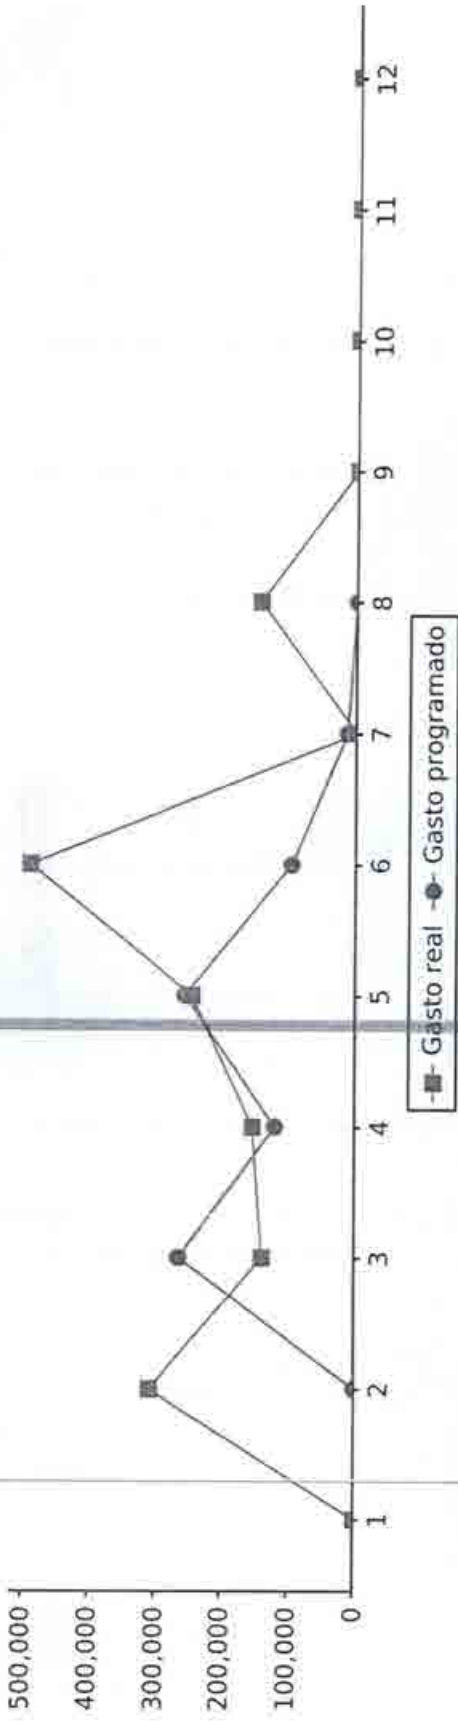

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	309,832.28	140,000.00	154,938.28	246,728.04	491,474.09	0.00	145,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												1,488,128.96
Total Gasto programado												750,089.31

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Anual de Ejecución

¹ Mes reportado

SEPTIEMBRE

² Ejercicio Fiscal

2018

³ Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	¹⁴ Fecha de última actualización	07/08/2018
⁵ Número de Préstamo		¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID	¹⁶ Fecha de vigencia	30/06/2018
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁷ Fecha de elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018
⁹ Unidad Ejecutora	207	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG	¹⁹ Meses de prórroga	36
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	²⁰ Plazo de ejecución	3,867
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	²² Suscripción	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas Ejecución Cierre

00000000 040

	Mensual		Anual		Total	
	Desembolso planificado	Q. 15,610,759.82	Ejecución Financiera	47%	Ejecución Financiera	0.47
Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00					
Presupuesto Vigente actual	Q.87,537,992.00	Q.13,103,872.62	Ejecución Física de metas	0.32		
Presupuesto Devengado		Q.2,506,887.20	Plazo de ejecución actual	100		
% de Ejecución Presupuestaria		Q.0.00				
		Presupuesto planificado próximo				

A1 METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -	Q 1,923,697.60	Q -		Q 3,378,750.00	Q 1,923,697.60
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	Q -
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -	Q 356,500.00	Q -		Q 1,334,000.00	Q 356,500.00
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -	Q 2,330,016.02	Q -		Q 2,547,666.22	Q 2,330,016.02
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	Q -
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q 9,101,666.22	Q 4,610,213.62
	Animal	Q 2,006,107.60		Q -	1082500	Q -		Q 2,006,107.60	Q 1,082,500.00
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	Q -
	Equipo agrícola	Q 203,000.00		Q -	158000	Q -		Q 203,000.00	Q 158,000.00
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -	900000	Q -		Q 1,750,000.00	Q 900,000.00
SERVICIOS RURALES	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -	6253159	Q -		Q 9,274,986.00	Q 6,253,159.00
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	Q -
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q 17,258,017.00	Q 8,393,659.00
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	Q -
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62		Q -		Q 75,892.86	Q -
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
UGP	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -		Q 151,785.71	Q 10,000.00
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90	Q 10,000.00	Q -		Q 370,535.71	Q 10,000.00
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	Q -
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquificación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	Q -
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29	Q 90,000.00	Q -		Q 200,892.86	Q 90,000.00
UPLASES	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43	Q 90,000.00	Q -		Q 379,553.58	Q 90,000.00
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33	Q 13,103,872.62	Q -		Q 27,919,596.51	Q 13,103,872.62

AZ Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio		Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Metros cuadrados	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotúnel	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Supervisión de infraestructura	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Informes	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1


COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados							Q. -	Q. -	Q. -	Q. 809,824.00	Q. -	Q. -	Q. 809,824.00	Q. 809,824.00
	Estufas Mejoradas		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 1,923,697.60		Q. -		Q. 1,455,052.40			Q. 3,378,750.00	Q. 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 341,250.00			Q. 341,250.00	Q. 341,250.00
	Pilas		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 356,500.00		Q. -		Q. 1,764,831.20			Q. 1,621,331.20	Q. 1,621,331.20
	Equipo de Riego		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 2,330,016.02		Q. -		Q. -			Q. 2,330,016.02	Q. 2,330,016.02
SERVICIOS RURALES	Piso Mejorado								Q. -		Q. 1,500,000.00			Q. 1,500,000.00	Q. 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 4,610,213.62	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 4,561,133.60	Q. -	Q. -	Q. 9,171,347.22	Q. 9,171,347.22
	Animal		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 1,082,500.00		Q. -		Q. 1,110,857.60			Q. 2,193,357.60	Q. 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 198,631.00			Q. 198,631.00	Q. 198,631.00
	Equipo agrícola						Q. 158,000.00		Q. -		Q. 273,000.00			Q. 431,000.00	Q. 431,000.00
UGP	Huertos con macrotúnel						Q. 900,000.00		Q. -		Q. 890,892.40			Q. 1,790,892.40	Q. 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 6,253,159.00		Q. -		Q. 3,021,827.00			Q. 9,274,986.00	Q. 9,274,986.00
	Pozos						Q. -		Q. -		Q. 3,299,468.98			Q. 3,299,468.98	Q. 3,299,468.98
	SUBTOTAL	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 8,393,659.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 8,794,676.98	Q. -	Q. -	Q. 17,188,335.98	Q. 17,188,335.98
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -				Q. 62,500.02			Q. 62,500.02	Q. 62,500.02
UPLACES	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 75,892.86			Q. 75,892.86	Q. 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 80,357.14			Q. 80,357.14	Q. 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 10,000.00							Q. 151,785.72	Q. 151,785.72
	SUBTOTAL	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 10,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 141,785.72			Q. 370,535.74	Q. 370,535.74
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico										Q. 360,535.74	Q. -	Q. -	Q. 31,339.70	Q. 31,339.70
TOTAL	Apoyo a seguimiento, evaluación, ejecución y cierre		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 31,339.70			Q. 66,964.29	Q. 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -		Q. -		Q. 80,356.72			Q. 80,356.72	Q. 80,356.72
	Informes		Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 90,000.00		Q. -		Q. 110,892.86			Q. 200,892.86	Q. 200,892.86
	SUBTOTAL	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 90,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 289,533.57	Q. -	Q. -	Q. 379,533.57	Q. 379,533.57
	TOTAL	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 13,103,872.62	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 141,815,733.89	Q. -	Q. -	Q. 27,919,596.51	Q. 27,919,596.51

A5 Proyección de desembolsos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q	Q	Q	Q	Q	Q 13,103,872.82	Q	Q	Q	Q 14,815,723.89	Q	Q
REALIZADO												
VARIACION												

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2018

Q16,000,000.00
Q14,000,000.00
Q12,000,000.00
Q10,000,000.00
Q8,000,000.00
Q6,000,000.00
Q4,000,000.00
Q2,000,000.00

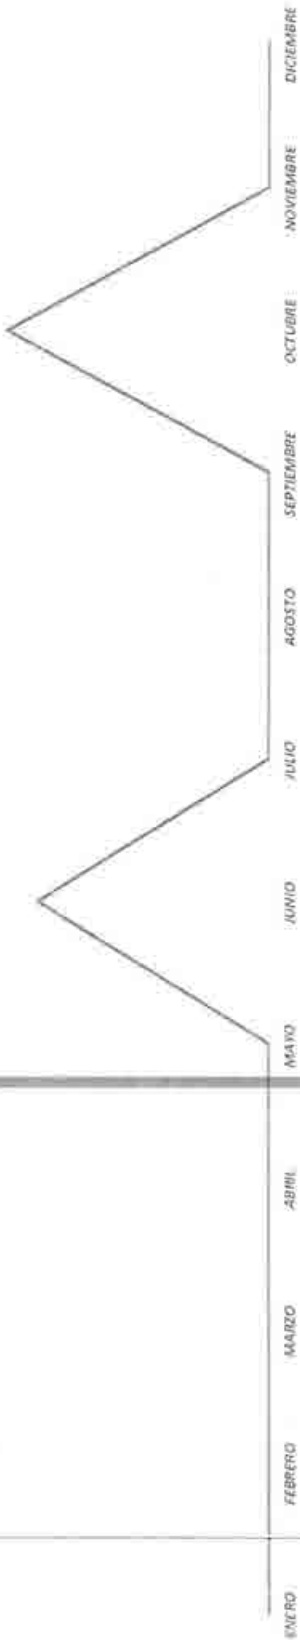

A7 Observaciones/Desafíos

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

A8 Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR


Ingrid Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental


Mildred Melissa Esquivel Gravez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural - El Quiché
Orizaba, Guatemala, 1 de Enero de 2018


MV José Felipe Orellana Mejía
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 08 de Octubre de 2018.



Observaciones / Desafíos

El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 8/10/2018 - 12:15 PM

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado


Septiembre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución

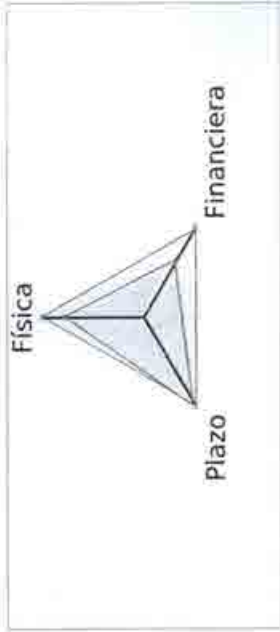

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Mes reportado

Septiembre / 2018


Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución

Física



Plazo

Financiera

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución

Cierre

000000000 030

Mes reportado


Septiembre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Numero de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución

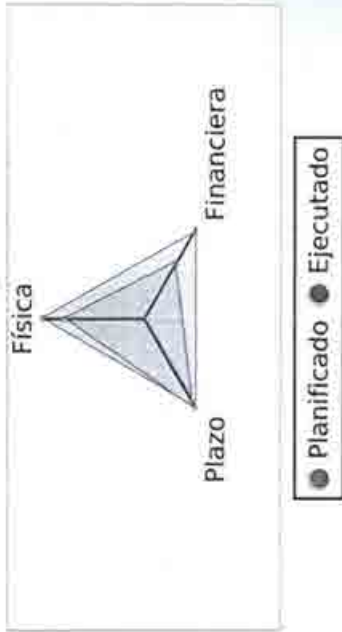

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Mes reportado


Septiembre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49	63.68%	3,995,394.51
		Monto por desembolsar USD\$	36.32%

Gráfica de Ejecución

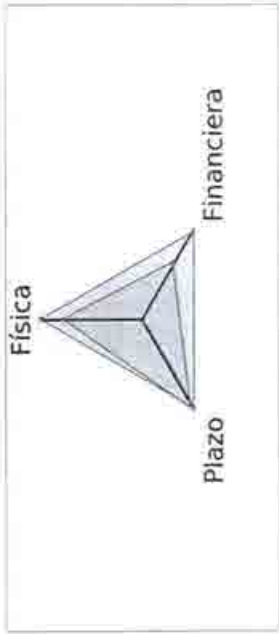

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Mes reportado


Septiembre / 2018

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Numero de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución

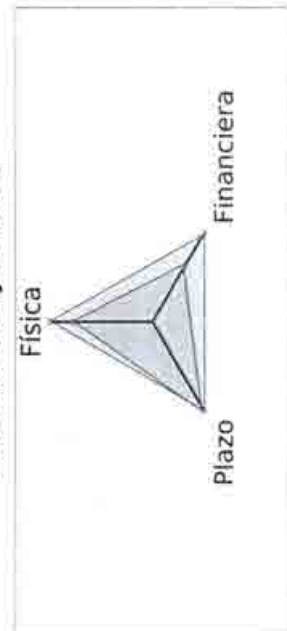

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Mes reportado

Septiembre / 2018


Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	08/10/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,700,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución

Física



Plazo Financiera

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución

Cierre

00000000 026

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre	Indicadores de Avance Anuales 2016		Total
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	Ejecución Financiera 13.00%
Presupuesto Vigente anual	24,864,522.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	71.84% / 100.00%
Presupuesto Devengado	13,003,782.62	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	47.86% / 100.00%
Porcentaje de Ejecución	52.30%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	12.4323

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa .-Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Unidad	1		0	1	0		1	1
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Servicios Rurales.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia	Unidad	1		0	1	0		1	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-									
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-	Unidad	1		0	1	0		1	1
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-	Unidad	2		0	1	0		2	1
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-	Unidad	1		0	1	0		1	1
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Planificación y programación		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Finis de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Ordenamiento Territorial y Descentralización											
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa. -Ampliación-											
Adquisición de estampadora, estufas ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	12/02/2018		14/02/2018		21/02/2018		27/02/2018		05/03/2018	
Desembolso al convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Juliapa, Jutiapa. -Ampliación-											
Adquisición de bombas de agua, instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	15/02/2018	11/06/2018	19/02/2018	11/06/2018	26/02/2018	11/06/2018	05/03/2018	11/06/2018	09/03/2018	11/06/2018
Negocios Rurales y Comercialización											
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-											
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		15/02/2018		20/02/2018	
Servicios Rurales											
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-											
Adquisición de Cabras e insumos agrícolas para la producción de vegetales	Participación de la comunidad en las adquisiciones	26/02/2018		28/02/2018		07/03/2018		09/03/2018		12/03/2018	
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa. -Ampliación-											
Adquisición de módulos caprinos, gallinas, implementación de huertos familiares, estufas ahorradoras de leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apiarios, equipo apícola	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018	12/06/2018	07/02/2018	12/06/2018	14/02/2018	12/06/2018	21/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-											
Adquisición de bombas para agua, implementación de un sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018	12/06/2018	21/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018	07/03/2018	12/06/2018	13/03/2018	12/06/2018

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-											
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/01/2018	12/06/2018	09/01/2018	12/06/2018	13/02/2018	12/06/2018	20/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-											
Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	31/01/2018	12/06/2018	02/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018	07/03/2018	12/06/2018	12/03/2018	12/06/2018
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliación-											
Adquisición de pilas plásticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018		22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		14/03/2018	
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-											
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego, construcción y equipamiento de pozo	Participación de la comunidad en las adquisiciones	21/02/2018		23/02/2018		02/03/2018		09/03/2018		16/03/2018	

00000000 021

Ejecución Financiera Anual


Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ordenamiento Territorial y Descentralización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa. -Ampliación-													
Adquisición de estampadora, estufas, ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua.	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00
Desembolso al convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aidea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-													
Adquisición de bombas de agua, instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	0.00	0.00	890,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,990.32
Total componente	0.00	0.00	2,575,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,990.32
Negocios Rurales y Comercialización.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-													
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	0.00	0.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00
Servicios Rurales.													
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-													
Adquisición de Cabras e insumos agrícolas para la producción de vegetales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,631.00
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-													
Adquisición de módulos caprinos, gallinas, implementación de huertos familiares, estufas ahorradoras de	0.00	0.00	0.00	8,099,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099,400.00

00000000 020

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apiarios, equipo apícola													
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-													
Adquisición de bombas para agua, implementación de sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.	0.00	0.00	2,223,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,175.90
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutla -Nuevo-													
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.	0.00	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040,000.00
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutla -Arrastre-													
Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.	0.00	0.00	0.00	3,234,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,966.00
Desembolso al convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepec, Jalapa -Ampliación-													
Adquisición de pilas plásticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-													
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego construcción y equipamiento de pozo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total componente	0.00	4,020,000.00	2,223,175.90	17,340,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,783,692.90
Total	0.00	4,020,000.00	2,223,175.90	17,340,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,783,692.90

000000 019

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

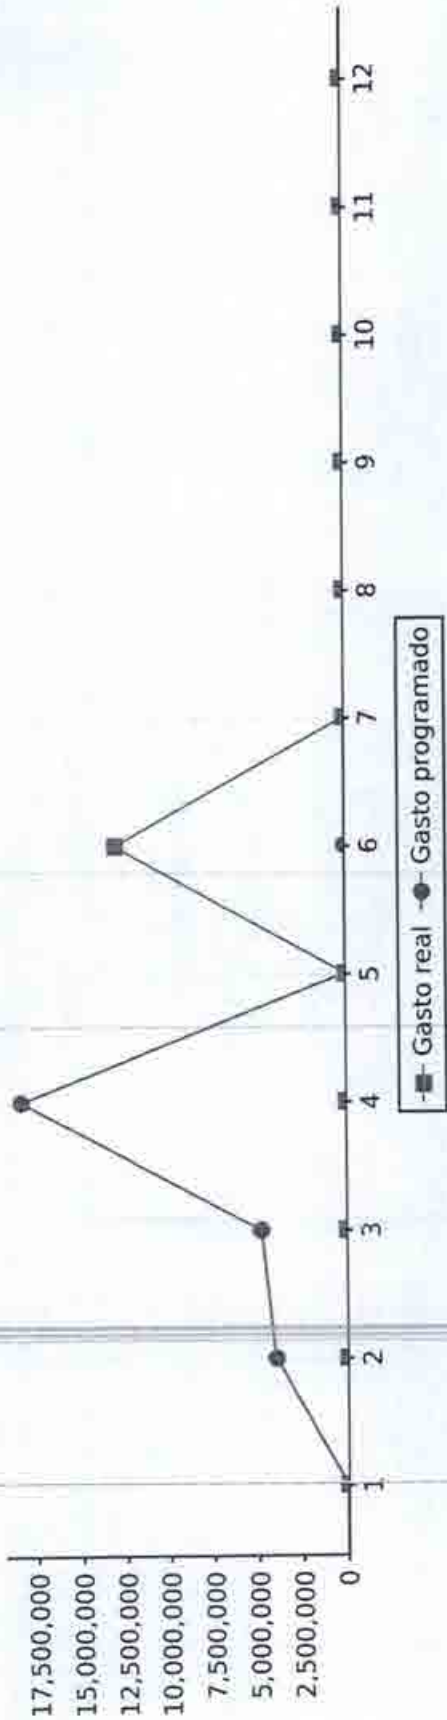

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ociubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003,782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,020,000.00	4,799,166.22	18,350,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												13,003,782.62
Total Gasto programado												27,169,507.22

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	712,694.25	0.00	724,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	712,694.25	0.00	-724,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000000 017

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

²Ejercicio Fiscal

SEPTIEMBRE
2018

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	¹¹ Fecha de última actualización	07/08/2018
⁵ Número de Préstamo		¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID	¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018
⁹ Unidad Ejecutora	207	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG	¹⁹ Meses de Prorroga	36
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	²⁰ Plazo de ejecución ²¹	3,867
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	²² Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.45 Y OFID 1182P: Q.60,571,800.31	²³ Suscripción	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas Ejecución Cierre

000000000 016

	Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q. 15,610,759.82	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera	0.47
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.13,103,872.62	Ejecución Físico de metas		
Presupuesto Devengado		Diferencia	Q.2,506,887.20	Plazo de ejecución actual		
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.0.00			
		Presupuesto planificado próximo	Q.0.00			

A1 METAS AÑO FISCAL 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -	Q 1,923,697.60	Q -		Q 3,378,750.00	Q 1,923,697.60
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	Q -
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -	Q 356,500.00	Q -		Q 1,334,000.00	Q 356,500.00
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -	Q 2,330,016.02	Q -		Q 2,547,666.22	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	Q -
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q 9,101,666.22	Q 4,610,213.62
	Animal	Q 2,006,107.60		Q -	1082500	Q -		Q 2,006,107.60	Q 1,082,500.00
SERVICIOS RURALES	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	Q -
	Equipo agrícola	Q 203,000.00		Q -	158000	Q -		Q 203,000.00	Q 158,000.00
	Huertos con macrotúnel	Q 1,750,000.00		Q -	900000	Q -		Q 1,750,000.00	Q 900,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -	6253159	Q -		Q 9,274,986.00	Q 6,253,159.00
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	Q -
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q 17,258,017.00	Q 8,393,659.00
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	Q -
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62		Q -		Q 75,892.86	Q -
	Supervisión de Infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -			
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90	Q 10,000.00	Q -		Q 151,785.71	Q 10,000.00
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 370,535.71	Q 10,000.00
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 31,339.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
UPLASES	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29	Q 90,000.00	Q -		Q 200,892.86	Q 90,000.00
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43	Q 90,000.00	Q -		Q 379,553.58	Q 90,000.00
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33	Q 13,103,872.62	Q -		Q 27,919,596.51	Q 13,103,872.62

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejoraco	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo agrícola	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con microtune	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectareas agrícolas habilitadas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Supervisión de infraestructura	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	de Informes	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1


A3 Ejecución Financiera Anual 2018

COMPONENTE	PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados							Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 809,824.00	Q 809,824.00
	Estufas Mejoradas		Q	Q	Q	Q	Q 1,923,697.60		Q		Q 1,455,052.40			Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 341,250.00			Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q	Q	Q	Q	Q 356,500.00		Q		Q 1,264,831.20			Q 1,621,331.20	Q 1,621,331.20
	Equipo de Riego		Q	Q	Q	Q	Q 2,330,016.02		Q		Q			Q 2,330,016.02	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado								Q		Q 1,500,000.00			Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	Q 4,610,213.62	Q	Q	Q	Q 4,561,133.60	Q	Q	Q 9,171,347.22	Q 9,171,347.22
	Animal		Q	Q	Q	Q	Q 1,082,500.00		Q		Q 1,110,857.60			Q 2,193,357.60	Q 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 198,631.00			Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola						Q 158,000.00		Q		Q 273,000.00			Q 431,000.00	Q 431,000.00
	Huertos con macrofrutales						Q 900,000.00		Q		Q 890,892.40			Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q	Q	Q	Q	Q 6,253,159.00		Q		Q 3,021,827.00			Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
SERVICIOS RURALES	Pozos						Q		Q		Q 3,299,468.98			Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	Q 8,393,659.00	Q	Q	Q	Q 8,794,676.98	Q	Q	Q 17,188,335.98	Q 17,188,335.98
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 62,500.02			Q 62,500.02	Q 62,500.02
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 75,892.86			Q 75,892.86	Q 75,892.86
	Supervisión de infraestructura		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 80,357.14			Q 80,357.14	Q 80,357.14
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q	Q	Q	Q	Q 10,000.00		Q					Q 151,785.72	Q 151,785.72
UGP	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	Q 10,000.00	Q	Q	Q	Q 141,785.72	Q	Q	Q 370,535.74	Q 370,535.74
	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico										Q 31,339.70			Q 31,339.70	Q 31,339.70
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 66,964.29			Q 66,964.29	Q 66,964.29
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q	Q	Q	Q	Q		Q		Q 80,356.72			Q 80,356.72	Q 80,356.72
	Informes		Q	Q	Q	Q	Q 90,000.00		Q		Q 110,892.86			Q 200,892.86	Q 200,892.86
	SUBTOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	Q 90,000.00	Q	Q	Q	Q 289,553.57	Q	Q	Q 379,553.57	Q 379,553.57
UPLASES	TOTAL	Q	Q	Q	Q	Q	Q 13,103,872.62	Q	Q	Q	Q 14,815,723.89	Q	Q	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

00000000 012

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real													
Gasto programado						13,103,872.62			-	14,815,723.89			27,919,596.51

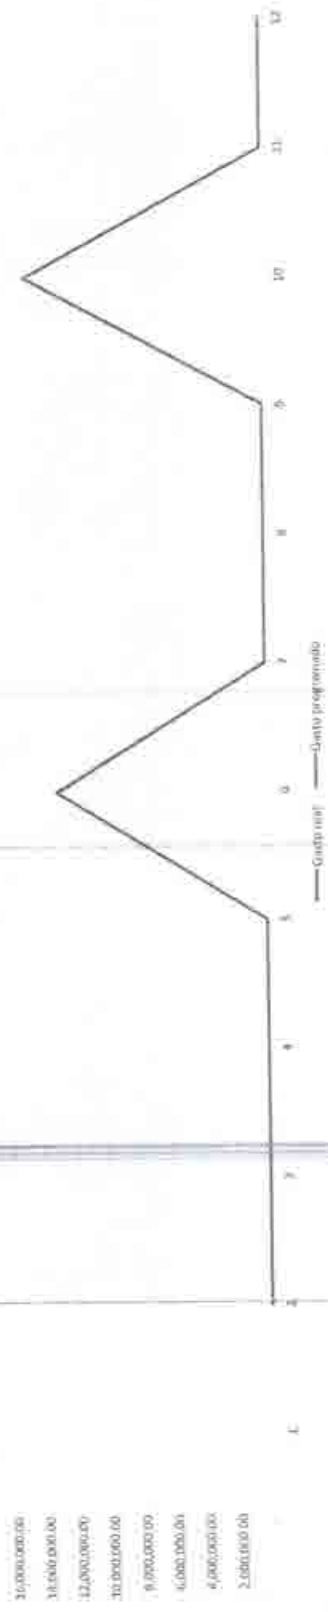


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q	-	Q	-	Q	Q13,103,872.62	Q	-	-	Q14,815,723.89			Q 27,919,596.51
Realizado													
Varación													

A5proyección de desembolsos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q	Q	Q	Q	Q	Q 13,103,872.82	Q	Q	Q	Q 14,815,723.89	Q	Q
REALIZADO												
VARIACION												

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2018

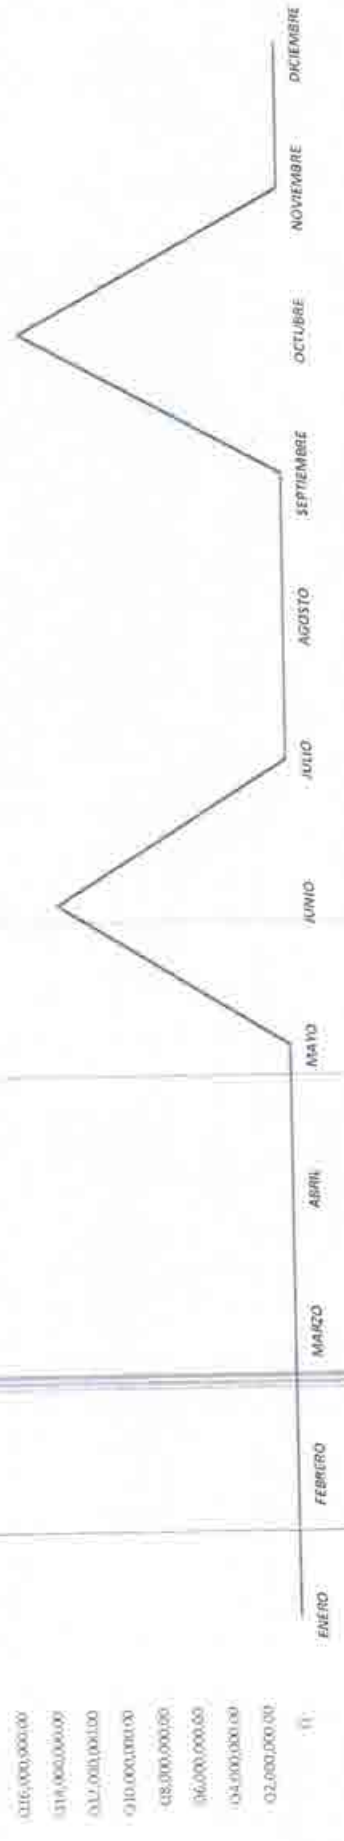


A7 Observaciones/Desafíos

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

A8 Riesgos

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Sureste


Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico al Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región
Oriente, Sureste y Nororiente



Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural


M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización: 08 de Octubre de 2018.

Observaciones / Desafíos

Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Grávez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 8/10/2018 - 12:14 PM

Ref. Oficio -PRODENORTE-AF-LC-ag-558-2018
Guatemala, 12 de octubre de 2018

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
-MAGA-

021467

Isabel 15:41

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sírvase encontrar los informes del Avance Físico Financiero de **FIDA 770-GT y OPEP-1414P** correspondiente al mes de septiembre 2018, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - **PRODENORTE**.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE


c.c.archivo

16 calle 15-49, zona 13. Ciudad Guatemala.

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



como: MAG

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: Septiembre
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Promotores	180	180	0	0.00%	Q900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Mujeres	100	100	0	0.00%	Q543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	Mujeres	300	300	0	0.00%	Q236,900.00	Q236,900.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer, (DMM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	Mujeres	269	269	0	0.00%	Q183,584.00	Q183,584.00	Q1.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares, Informes de asistencia técnica y monitoreo	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q90,000.00	Q90,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Gráfico y documento final	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chetumal, Raxruhá y Sanabá.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.	
	Inversión en planes de negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	26	26	10	38.46%	Q25,854,568.93	Q25,854,568.93	Q974,458.02	3.77%	Convenio firmados	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,000.00	Q30,000.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera (Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario)	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.	

Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Feria Agropecuaria y de Servicios Financieros (Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros)	Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	102	50.00%	Q2,642,400.00	Q2,642,400.00	Q220,200.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
			1,746	1,746	112	6.41%	Q34,590,054.91	Q34,590,054.91	Q1,194,649.02	3.45%	

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes										
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales			
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	No. de personas capacitadas/No. de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Unidad de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Fidel de Escalante, Sistema de Información SAFFEC, Interacciones (Acciones) en el territorio, Dirigido a: Técnico extensionista, Jefes de Departamento de MAGA, Unidad de Género, Docentes, equipo de extensión de PRODENVITE, Iteja Varapá, hombres 21 Mujeres 21, Atta Vinas, Hombres 27 Mujeres 28			
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad	No. de personas formadas/No. de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Elaboración de TOR, y capacitación sobre género en las acciones Q. DHOIE, CHICAI,			
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	No. Personas formadas/No. de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. Personas formadas/No. de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Elaboración de TOR			
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer (DMM)	No. de DMM formadas/No. de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	No. de personas capacitadas/No. de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	Se formaron 3 nuevos CADER en ahorro y préstamo comunitario en Santa María Calabón			
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ican, Puruhá, Chise, Razuná y Senahú.	No. de viveros y dotación de insumos programados/ No. de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.03	Actas de entrega de insumos	Se contrato un consultor para dar asistencia y asistencia técnica en viveros Agroforestales			
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No. de botiquines programados/ No. de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	Se elaboraron las listas de licitación para la compra de los medicamentos que se incluyen en los Botiquines Pecuarios, solo falta su aprobación por parte de la subdirección financiera para ser publicados en Quetzaltenango.			
	Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales									

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2018	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados.	1.00	1.00	0.10	Acuerdos y Convenios firmados.	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas: Segundo desembolso de diversas cadenas productivas: Asociación Santa María Cahabon, Alta verapaz, Asociación de productores de café de Chichupac A.P.C.C., B.V., Asociación de productores de café de Chichupac A.P.C.C., Rabinal, Asociación de productores de maní Q'eq'chi Chimal, San Miguel Chimal
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	0.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. de documentos realizados/ No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensiónismo rural	Numero de personas contratadas durante un año/Numero de personas previstas para realizar el extensiónismo rural	1.00	1.00	0.60	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
Recurso comparativo		IV.2. Valoración Balance			
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		Se hizo el Segundo desembolso de diversas cadenas productivas:Asociación de productores para el desarrollo rural de K'aj'ib'on Aprodetrak , Santa María Cahabon, Alta verapaz, Asociación de vecinos agricultores de desarrollo integral el durazno Avadid Purulha B.V, Asociación de productores de café de Chichupac A.P.C.C. Rabinal, Asociación de productores de manita Q'eq'oj Chimalj, San Miguel Chimalj.			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
5.19%	17%	Variación % Física	0.22%		
		Variación % Financiera	14%	IV. 3. Alertivos	
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Se esta en espera de modificaciones presupuestarias, para la ejecución del POA 2018, para la ejecución en los demás componentes.			
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA			
6.41%	3%				

Firma Elaborado Por

[Firma]

Linda Maria Luceth Caranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

[Firma]

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

[Firma]

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

I. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dfo. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	
Mes a Reportar:	Septiembre	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.	
Entidad:	VIDER	Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.	
Unidad Ejecutora:	MAGA		
Préstamo:	OPEP 1414P		
Código Presupuesto:	404 013		

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado
	DOTACION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	Q6,750,000.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Puatub, Santo Tomas II, Guadalupe, Bititun, Iximsha, Camical, Sacate y Xalcaná	Km	15.32	15.32	15.32	1	Q850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Leal, Roha Y'ín, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Palate Itbolay y Las Lagunas del Faisán I.	Km	19.2	19.2	19.2	1	Q1,168,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidambar a Caserio Centro Panchoyic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzós, Guichavaran y Cruce Caserio Sachoso, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Santa Catalina Chajaneb, Santo Tomas Chajaneb y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Sobzil a Chexena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Paapa, Secticmil, Chalicoal y Santa Cecilia Chajaneb, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz".	Km	29.32	29.32	0	0	Q11,636,216.80	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Caminos e										

00000000 003

	Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea de Saquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Unión, Nuevo Sinal, San Pedro Unión y Caserio Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz"; "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea San Miguel Sechochoc, del Municipio de Itzamal, Alta Verapaz"; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Yalchacti, Palestina, Getsemani y las Papayas, del Municipio De Chisec, Alta Verapaz	Km	36.46	36.46	0	0	Q11,489,760.00	Q11,489,760.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de la Aldea Popébal, Aldea Naxhumbal, San Pablo Tamahú, Alta Verapaz. Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Tamax, Chiloyel, Marbach, Chicaja y Chilarach, del Municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz". "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de La Aldea de Chipacay, del Municipio de San Pablo Tamahú Alta Verapaz; y "Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de las Violetas, Chipocóla, Sesarb Cruce a Santo Domingo y Sesarb Centro, del Municipio de San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Km	29.19	29.19	0	0	Q9,097,980.00	Q9,097,980.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas	Plan	1.000	1	0	0	Q9,275,180.67	Q9,275,180.67	Q0.00	0%	Convenios firmados.
Total			130	129	34.52	26.66%	Q50,267,137.47	Q50,267,137.47	Q0.00	0%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
Avance del mes							
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2016	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas Aclaratorias
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se avanza en la perfilación del proyecto
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades
	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales							

IV.2. Valoración Balance										
Los proyectos carreteros están en modificación de las observaciones que hiciera FIDA, las base de los aljibes están en no objeción en FIDA.										
BALANCE DE LA GESTIÓN										
Recuento comparativo										
I. GESTIÓN MES ANTERIOR										
EJECUCIÓN FÍSICA										
1%	3%	Variación % Física	27%							

000000002

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	Avance del mes				III.8 Notas Aclaratorias
		III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación
		Variación % Financiera				
IV.2 GESTIÓN AL MES						
EJECUCIÓN FÍSICA						
		27%				
EJECUCIÓN FINANCIERA						
		0%				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaynardo Bar...

Lcda. Maria Luceth Carranza Zelada
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado Por...

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural



100 00000000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	Ref. Oficio No. DCPF-1423-2018/hv	No. de Referencia:	68147
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	19/10/2018 11:50 a.m.	Folios:	52
Asunto:	Se envía el Informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de septiembre 2018.		

Trasladar A:

- ☐ Blanca Morayma Castaneda Vargas
- ☐ Christian Fernando Rodas Flores
- ☒ Hulda Priscila Castellanos
- ☐ Juan Esteban Ordóñez González
- ☐ Luis Leonel Villeda Hurtarte
- ☐ María Luisa Hernández Giron
- ☐ Melvin Ivan Polanco Donado
- ☐ Selvin Arnoldo Mérida
- ☐ Sergio Anibal Molina Rosales

Detalle de traslados:

Propósito:

- ☐ Archivar
- ☐ Asistir
- ☐ Atender lo solicitado
- ☐ Emita Opinión
- ☐ Informe sobre el particular
- ☐ No procede lo solicitado
- ☐ Otros: _____
- ☐ Para su estudio y dictamen
- ☐ Procédase como se solicita
- ☐ Responder
- ☐ Su conocimiento y Efectos

Observaciones:

Selvin Arnoldo Mérida G.
F. JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MAGA Firma y Sello

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Decreto 13-2013, Artículo 17 Ter, inciso g)

Entidad	Oficio	Asunto
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos -DCPF-	DCPF-1671- 2018/hv del 16 de noviembre de 2018	<p>"Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico - Financiero" del bimestre septiembre-octubre de 2018, emitidos en el "Sistema de Planificación Internacional -SIGEACI- de SEGEPLAN de los siguientes proyectos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA 2. Programa de Industrialización del Bambú en Guatemala. 3. Fortalecimiento a los servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2Kr, Fase VIII. 4. Programa Atención a Afectados por el Cambio Climático el Niño en el Corredor Seco. 5. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Nore - PRODENORTE-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
16 NOV 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

20 NOV 2018

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: 16:19 POR: [Firma]

UDAF MAGA NO 25 NOMBRE: Fla M.
- MAGA -

Contabilidad	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesorería	<input type="checkbox"/>
Unidad de Apoyo	<input type="checkbox"/>

Ref. Oficio No. DCPF-1671-2018-1/2/hv
Guatemala, 16 de noviembre de 2018

Respetable Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 y sus reformas, y al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero" emitidos por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre **Septiembre-Octubre de 2018** de los siguientes proyectos:

1. Programa Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
2. Programa Industrialización del bambú en Guatemala
3. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2Kr, Fase VIII.
4. Programa Atención a Afectados por Fenómeno Climático el Niño en el Corredor Seco de Guatemala.
5. Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015.
6. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20
20 NOV 2018
Hora: 12:34 Firma: [Firma]
Registro Único de Excediente
Tel: 1575

2018-93131

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
20 NOV 2018
UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
21 NOV 2018
Hora: 11:35 Firma: PAULINA RUIZ [Firma]
1:30 FIRMA: [Firma]

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio MAGA Nivel 3, PBX: 2413 7000 Ext. 7230

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



© 2018 MAGA

Así mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato PDF de los programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Inga. Melida Luján
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA



Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República –
SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

c.c.: Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. Erick Sarabia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio MAGA Nivel 3, PBX: 2413 7000 Ext. 7230

Guatemala, 12 de noviembre de 2018
Of.PFCH-MAGA-FIDA-141-2018 MG

Ingeniera
Melida Lucía Izquierdo
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su despacho.

Estimada Licda. Izquierdo:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo del presente oficio es para trasladar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- del Programa Fortalecimiento de la Capacidad Institucional - Donación Pequeña Cuantía; ya ingresado al Sistema SIGEACI.

No está demás indicarle que el Programa se encuentra en la fase de cierre con las gestiones respectivas y realizar el cierre del Programa ante SEGEPLAN.

De antemano agradecemos su atención a la presente,

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



Licda. María Eugenia González Argueta
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-07 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicando Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2018
Fecha de impresión: 12/11/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI64
Nombre del Programa/Proyecto: Donación de Pequeña Cuanía No. 200000538-GT "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación"
Dependencia: Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de SyE del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Se dará mayor énfasis a:
- La capacidad del MAGA para prestar servicios de apoyo a la población rural pobre.
Promover la gestión del conocimiento y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural entre las partes interesadas en Guatemala y entre regiones.
No. de Donación: 200000538-GT
Estado del proyecto: Solicitud Finalizado
Fecha de suscripción: 17/11/2014
Fecha de inicio: 17/11/2014
Fecha de finalización vigente: 30/6/2018
Fuente Cooperante: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,419,641.93
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 3,436,015.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,408,524.96
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 244,741.45
Monto total ejecutado:	Q. 2,653,266.41
% Avance Financiero:	60.03
% Avance Físico:	59.96

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: María Eugenia González Argueta
Apoyo Profesional Administrativo

María Eugenia González Argueta
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: María Eugenia González Argueta
Apoyo Profesional Administrativo

José Felipe Crallana Mejía
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-07 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionalado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2018
Fecha de envío:	12/11/2018
Dependencia:	Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Maria Eugenia Gonzalez Argueta
Correo Electrónico:	egonzalez.maga@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEAC164
Nombre del Programa/Proyecto:	Donación de Pequeña Cuenta No. 200000538-GT "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación"

No. de Donación:

200000538-GT

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

745-2014

Fuente Cooperante:

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Dirección Física del Proyecto:

7ma avenida 6-80 interior INAB, zona 13 (VIDER)

Teléfono directo del Proyecto:

24137000 ext 7072

Institución Ejecutora:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Dirección de la Institución Ejecutora:

7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades institucionales y de SyE del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza. Se dará mayor énfasis a:

•La capacidad del MAGA para prestar servicios de apoyo a la población rural pobre.

Promover la gestión del conocimiento y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural entre las partes interesadas en Guatemala y entre regiones.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Brindar asistencia técnica especializada en procesos de fortalecimiento institucional para la gestión técnica y administrativa de programas de cooperación del MAGA, a través de especialistas temáticos y eventos de construcción de capacidades, garantizando la sostenibilidad del conocimiento y los procesos dentro de la institución.

2. Fortalecer las capacidades institucionales y los sistemas operativos del MAGA, a través de la creación de sinergias e intercambios entre el FIDA y organizaciones nacionales e internacionales.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	17/11/2014
Fecha de inicio:	17/11/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	5/12/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2017
Fecha de finalización original:	31/12/2016
Fecha de finalización vigente:	30/6/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
I	12/4/2016	14/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2016 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2016 POR 31/12/2017

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Primer desembolso USD 450,000 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del convenio de donación firmado por el representante legal del receptor, y el formulario con la información bancaria completa. Segundo desembolso: USD 50,000 será desembolsado después de la recepción satisfactoria por el FIDA, del Informe de terminación y el Informe Final de auditoría.	Al contar con la documentación

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.81311	3,906,555.00
Total:		500,000.00		3,906,555.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	65,670.00	7.81311	513,086.93
Total:		65,670.00		513,086.93
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		565,670.00		4,419,641.93

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.81311	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	500,000.00	7.81311	3,906,555.00
Total:		500,000.00		3,906,555.00
Monto Total		500,000.00		3,906,555.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
17/6/2015	450,000.00	7.63559	3,436,015.50
Total:	450,000.00		3,436,015.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador/ Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Capacitación	796,937.22	0.00	796,937.22	455,060.09	57.10%
CATEGORIA - Consultorias	943,433.03	0.00	943,433.03	609,910.71	64.65%
CATEGORIA - Costos Operativos	376,201.25	0.00	376,201.25	233,721.29	62.13%
CATEGORIA - Equipo	321,900.13	0.00	321,900.13	112,281.24	34.88%
CATEGORIA - Personal	386,748.95	0.00	386,748.95	369,012.90	95.41%
CATEGORIA - Talleres	1,081,334.42	0.00	1,081,334.42	628,538.73	58.13%
Total	3,906,555.00	0.00	3,906,555.00	2,408,524.96	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador/ Resultado/ Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
CATEGORIA - Administración (contrapartida)	513,086.93	0.00	513,086.93	244,741.45	47.70%
CATEGORIA - Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Consultorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Costos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CATEGORIA - Talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	513,086.93	0.00	513,086.93	244,741.45	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,221,340.99	0.00	0.00
Febrero	1,221,340.99	0.00	0.00	0.00
Marzo	1,221,340.99	0.00	41,400.00	3.39
Abril	1,221,340.99	0.00	18,000.00	1.47
Mayo	1,221,340.99	0.00	18,000.00	1.47
Junio	1,221,340.99	0.00	51,339.29	4.20
Junio	1,221,340.99	0.00	9,246.88	0.76
Junio	1,221,340.99	0.00	5,542.85	0.45
Julio	1,221,340.99	0.00	0.00	0.00
Total:	0.00		143,529.02	11.75%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	70,650.00	168,700.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	1,350.00	15,924.00	0.00
Avance Físico	30.00	70.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
CATEGORIA - Talleres	0 %	51.53 %
CATEGORIA - Personal	0 %	95.42 %
CATEGORIA - Equipo	0 %	34.38 %
CATEGORIA - Costos Operativos	0 %	62.12 %
CATEGORIA - Consultorias	0 %	71.26 %
CATEGORIA - Capacitación	0 %	57.09 %

CATEGORIA - Administración (contrapartida)	0 %	47.90 %
Total:	0.00	59.96

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
60.03 %	59.96 %	11.75 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

- Desembolsos
- Ejecución Financiera
- Ejecución presupuestaria
- Ejecución física

Ref: 70107



Bárcena, Villa Nueva, 06 de noviembre de 2018
Oficio DCA-PIB 456/11/2018

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente.



Estimada Ingeniera Izquierdo:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema de Gestión Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI- de la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN-, correspondiente al quinto bimestre comprendido del 01 de septiembre al 31 de octubre del año 2018 del **"Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala"** ejecutado por el Departamento de Cultivos Agroindustrializables.


Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Cordialmente,


Ing. Agr. Enrique Tobar Figueroa
JEFE DEPARTAMENTO CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES
VIDER-MAGA



Vo. Bo.


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Adjunto: Lo indicado
C.C. Archivo

Km.22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba, Tel.:6640-9309, Correo Electrónico:cultivosagroindustrializables@gmail.com

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF - **Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edición de Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2018
Fecha de impresión: 06/11/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.
No. de Donación: 23.64
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de finalización vigente: 31/12/2018
Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 22,482,678.41
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 7,445,557.19
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 11,810,694.38
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 11,810,694.38
% Avance Financiero:	52.53
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Sindy Valenzuela
Asistente

Rolando Enrique Tobar Figueroa
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Miguel C.
Técnico Agrícola

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2018
Fecha de envío:	06/11/2018
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico:	acmetobar@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto:	Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación:	23.64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	253-2014
Fuente Cooperante:	China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto:	Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto:	6640-9317
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.

Objetivo(s) Específico(s):

1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.
2. Introducir una nueva variedad (*phyllostachys pubescens*) para aumentar la diversidad de productos de bambú.
3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú
5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/1/2014
Fecha de Inicio:	13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2018
Fecha de finalización original:	31/12/2018
Fecha de finalización vigente:	31/12/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Sistema:

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:**Registro de SICOIN:**

11130012020561019

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la Institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Sexo	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
9/11/2016	236,642.70	7.52367	1,780,421.58
6/2/2018	514,997.00	7.34201	3,781,113.12
Total:	998,562.70		7,445,557.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	11,810,694.38	52.53%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	11,810,694.38	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto Ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Marzo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Abril	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Mayo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	273,013.35	9.10
Junio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	148,446.67	4.95
Julio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	112,379.35	3.75
Agosto	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	411,839.06	13.73
Septiembre	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	92,000.00	3.07
Octubre	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	114,880.00	3.83
Total:		0.00		1,152,558.43	38.42%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	600,000.00	1,700,000.00	700,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
52.53 %	100.00 %	38.42 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL

DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA
Y AGROINDUSTRIA

Ref. Oficio - DFA-JD-228-2018
Guatemala, 13 de Noviembre del 2018

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Presente



001621

Estimada Directora:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos y esperando que todas sus actividades se realicen satisfactoriamente.

Adjunto se servirá encontrar el Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero del Proyecto **"Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Nacional 2KR, Fase VIII"**, correspondiente a Septiembre-Octubre 2018, para que por su medio sea trasladado a SEGEPLAN.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Alex Montenegro Quintana
Jefe Depto. de Fruticultura y Agroindustria
VIDER - MAGA



ADJ: Lo indicado
c.c. Dirección de Desarrollo Agrícola
Archivo correlativo
ASMQ/ja

Km. 22 Carretera al Pacífico, edificio La Ceiba, Bárcena, Villa Nueva
Tel: 6640-9377 Correo Electrónico: defruta.admon@maga.gob.gt

www.maga.gob.gt

Síguenos en:



Compartir en:



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2018
Fecha de envío:	05/11/2018
Dependencia:	Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFruta-
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Alex Sarael Montenegro Quintana
Correo Electrónico:	montenegroas@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M. V. José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	viderdespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
No. de Donación:	61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	345-2005
Fuente Cooperante:	Japón
Dirección Física del Proyecto:	La Alameda, Chimaltenango
Teléfono directo del Proyecto:	66409323, 78397463
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca. Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
-------------------	--

Objetivo(s) Específico(s):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizar la infraestructura de DEFruta para la implementación de dos áreas de proceso, que incluye 5 líneas de producción con oportunidades para el país. 2. Implementar servicios de apoyo a la cosecha, pos cosecha y procesamiento agro industrial, a través del equipamiento de un laboratorio integral de análisis de productos frescos y procesados.
----------------------------	--

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	16/6/2005
Fecha de inicio:	16/6/2005
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	16/6/2005
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	31/12/2015
Fecha de finalización original:	31/12/2015
Fecha de finalización vigente:	31/12/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113001205090026

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
Total:		5,939,140.00		5,939,140.00
Monto Total		5,939,140.00		5,939,140.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	225
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1310
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	20
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	40
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	210
Rural	Indígena	Femenino	16-49	330
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	215

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2015	5,939,140.00	1.00000	5,939,140.00
10/1/2018	0.00	0.00000	0.00

Total: 5,939,140.00

5,939,140.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	94.35%
Total	5,939,140.00	0.00	5,939,140.00	5,603,490.35	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 1. Construcción de la planta, compra de equipo, mantenimiento de equipo, capacitaciones, elaboración de proceso de frutas, remodelación de infraestructura	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
94.35 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	

Ejecución Financiera**Ejecución presupuestaria**

En reunión sostenida con personal de UDAFA del MAGA central, UDAFA-VIDER y con La Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos en fecha 29 de agosto del presente año, se informó que el MINFIN no ha autorizado los recursos financieros para ejecución del 2018. Las UDAFAS hicieron un análisis en conjunto y determinaron que el tiempo es limitado para las compras por que aun no se cuenta con cuota presupuestaria.

La propuesta final discutida fue que se tenga definido el listado de insumos y equipo, especificaciones técnicas para poder ingresarlos a donde corresponda para el proceso de compras en el año 2019.

Ejecución física

Se continua con capacitaciones a productores y productoras en el procesamiento de frutas, así mismo se capacitaron 21 educadores del Hogar representantes de 7 departamentos del país, que están trabajando con la Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica. Estos eventos de capacitación se realizaron en la planta de Agroindustria Chimaltenango



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2018
Fecha de impresión: 05/11/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI36
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento a los servicios de apoyo a la agroindustria frutícola nacional 2KR Fase VIII
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, departamento de Fruticultura y Agroindustria - DEFRUTA-
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Fortalecer los servicios de apoyo a la pos cosecha y agroindustria frutícola nacional, que permita alargar la cadena productiva agregando valor a través del manejo de cosecha y del manejo pos cosecha y la transformación de productos terminados o insumos para otros procesos agro industriales.
No. de Donación: 61-0509-0026/JAP 2KR Fase VIII
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 16/6/2005
Fecha de inicio: 16/6/2005
Fecha de finalización vigente: 31/12/2015
Fuente Cooperante: Japón

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 5,939,140.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 5,939,140.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 5,603,490.35
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 5,603,490.35
% Avance Financiero:	94.35
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Ing. Agr. Zoila Lucrecia Monzón Martínez
Coordinadora Área de Competitividad e Innovación Frutícola

Ing. Alex Sáfai Montenegro Quintana
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Luis Ramón Padilla
Encargado Área de Agroindustria

M. V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución





Oficio ref. DAAN-2018-11-845
Guatemala, 15 de noviembre de 2018

Ingeniera
Melida Lucia Izquierdo
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente

Estimada Ingeniera:

De manera atenta y en seguimiento a su Oficio No. DCPF-1022-2018/hv, referente al informe físico y financiero del "Programa de Atención a las Familias Afectadas por la Canícula Prorrogada 2015" y Atención a afectados por el fenómeno climático el niño en el corredor Seco de Guatemala 2015".

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la solicitud de entrega bimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, me permito trasladarle los dos resúmenes ejecutivos e informes de avance físico y financiero -IAFF- correspondiente al quinto bimestre del año 2018.

Atentamente,

Heber Cesario Arana
ig. Agr. Heber Cesario Arana
DIRECTOR DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VISAN - MAGA



CC. Lic. Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
Ing. Manfred Melgar Padilla, Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-
Lic. Carlos Chacón, Dirección de Monitoreo y Logística
Archivo

HAQ/II

15 Avenida 24-27 zona 13, Residenciales El Mirador



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2018
 Fecha de impresión: 08/11/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI66
 Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
 Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Objetivo General: Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015.
 No. de Donación: 0401-0029
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 13/1/2016
 Fecha de inicio: 4/3/2016
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2016
 Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,919,172.50
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,919,172.50
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,919,172.50
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacon Lemus
 Director de Monitoreo y Logística

Ing. Heber Cesar Arana
 DIRECTOR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
 Ing. Heber Arana - MAGA
 Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Area Técnica: Erwin Estuardo Gutiérrez Dávila
 Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria

Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2012, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2018
 Fecha de envío: 08/11/2018
 Dependencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Heber Arana
 Correo Electrónico: arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI66
 Nombre del Programa/Proyecto: Mitigar los efectos de la sequía provocada por el fenómeno climático El Niño corredor seco en el Departamento de Jutiapa.
 No. de Donación: 0401-0029
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 94-2016
 Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
 Dirección Física del Proyecto: 7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
 Teléfono directo del Proyecto: 24137412
 Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Contribuir en la reducción del riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional en familias dedicadas a la agricultura de subsistencia e infrasubsistencia, afectadas por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la prolongación de la canícula durante el año 2015

Objetivo(s) Específico(s):

Las raciones se entregarán en: Atestatampa, El Adelanto, Jaipatagua, Jutiapa, Pasaco y Zapotitlán.
 La ración consiste en:
 30 libras de harina de maíz
 30 libras de Frijol Negro
 17.6 lbs de harina de maíz y soya

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/1/2016
 Fecha de inicio: 4/3/2016
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/3/2016
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2016
 Fecha de finalización original: 31/12/2016
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

20404010029

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:		250,000.00		1,919,172.50
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		250,000.00		1,919,172.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4220
Rural	Indígena	Masculino	16-49	1056

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/3/2016	250,000.00	7.67669	1,919,172.50
Total:	250,000.00		1,919,172.50

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	100.00%
Total	1,919,172.50	0.00	1,919,172.50	1,919,172.50	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - REDUCIR EL RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA E INFRASUBSISTENCIA, AFECTADAS POR LA CANICULA 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2201 - JUTIAPA - JUTIAPA	0.00	875,558.80
2207 - JUTIAPA - ATESCATEMPA	0.00	303,008.09
2209 - JUTIAPA - EL ADELANTO	0.00	146,229.60
2210 - JUTIAPA - ZAPOTITLAN	0.00	79,662.39
2212 - JUTIAPA - JALPATAGUA	0.00	431,413.68
2215 - JUTIAPA - PASACO	0.00	83,299.94
Total	0.00	1,919,172.50

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

CIERRE DEFINITIVO DE DONACION ANTE MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y DONANTE	SE SOLICITO A UDAF EL CIERRE DEFINITIVO DE LA CUENTA SECUNDARIA ANTE FINANZAS PUBLICAS Y CARTA DE NO OBJECION DEL DONANTE.
--	--

Ejecución presupuestaria

Ejecución física



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2018
 Fecha de impresión: 08/11/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI65
 Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la canícula prolongada 2015
 Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Objetivo General: Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutitapa
 No. de Donación: 61-602-31
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 3/11/2015
 Fecha de inicio: 31/12/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/8/2016
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,812,925.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 3,812,925.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 3,812,925.00
% Avance Financiero:	100.00
% Avance Físico:	100.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Lic. Carlos Chacón
 Director de Monitoreo y Logística

Ing. Agr. Heber Cesario Padilla
 DIRECTOR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
 Ing. Heber Arana
 Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Erwin Estuardo Gutiérrez Dávila
 Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria

Ing. Agr. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 15-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2018
 Fecha de envío: 08/11/2018
 Dependencia: Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN
 Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ing. Heber Arana
 Correo Electrónico: arana.heber@yahoo.es

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Viceministro Ing. Manfred Alberto Melgar Padilla
 Correo Electrónico: visandespacho@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI65
 Nombre del Programa/Proyecto: Atención de Familias vulnerables en inseguridad alimentaria por la
 canícula prolongada 2015
 No. de Donación: 61-602-31
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: China (Taiwán)
 Fuente Cooperante: 7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
 Dirección Física del Proyecto: 24137412
 Teléfono directo del Proyecto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala
 Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Reducir el riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional de familias rurales de hogares agropecuarios afectados por la pérdida de cultivos de granos básicos debido a la falta de lluvias en el año 2015, en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta de Jutiapa
 Adquisición de raciones para 11,069 familias así:

Objetivo(s) Específico(s):

frijol 25 libras, harina de maíz nixtamalizada 30 libras y mezcla de harina de maíz y soya con azúcar, fortificada e instantánea 17.6 libras.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 3/11/2015
 Fecha de inicio: 31/12/2015
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 31/12/2015
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/8/2016
 Fecha de finalización original: 31/8/2016
 Fecha de finalización vigente: 31/8/2016

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No contamos con documentos que evidencien requisitos antes de recibir el desembolso	Pendiente de revisión

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.62585	3,812,925.00
Total:		500,000.00		3,812,925.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.62585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		3,812,925.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	11409

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	100.00%
Total	3,812,925.00	0.00	3,812,925.00	3,812,925.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Población afectada por canícula prolongada 2015	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
2211 - JUTIAPA - COMAPA	0.00	1,681,016.62
2213 - JUTIAPA - CONGUACO	0.00	567,719.43
2214 - JUTIAPA - MOYUTA	0.00	732,227.13
2217 - JUTIAPA - QUESADA	0.00	831,938.94
Total	0.00	3,812,902.12

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
CIERRE DEFINITIVO DE DONACION ANTE COOPERANTE Y FINANZAS PUBLICAS	SE SOLICITO A UDAF EL CIERRE DEFINITIVO DE LA CUENTA SECUNDARIA ANTE FINANZAS Y CARTA DE NO OBJECION POR EL DONANTE

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fidecomisos
-MAGA-


Estimado Ingeniera Izquierdo:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y Donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Me permito adjuntar el Informe del Bimestral 5 del año 2018, para la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- de Avance Físico y Financiero -IAFF- del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Lucía María Luceth Carranza Zelava
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



001641
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDECOMISOS
14-11-18
10:12
Jacks

c.c archivo

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2018
Fecha de impresión: 09/11/2018

II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto: PRODENORTE
Dependencia: MAGA
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.
No. de Donación: 1070-GT
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 13/12/2011
Fecha de inicio: 27/1/2012
Fecha de finalización vigente: 30/9/2019
Fuente Cooperante: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

III RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 6,396,680.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 6,921,000.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 427,500.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 427,500.00
Monto total ejecutado:	Q. 855,000.00
% Avance Financiero:	13.37
% Avance Físico:	13.09

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Luis Jacobo Rodas
Informática
Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE

Gustavo Adolfo Pereira González
Gerente/ Director/ Coordinador
Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE

Responsable Área Técnica, Francisco Moreno
Planificación

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Máxima autoridad de la Institución



**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -****Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2018
Fecha de envío:	09/11/2018
Dependencia:	MAGA
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre:	Gustavo Adolfo Pereira González
Correo Electrónico:	prodenortegt@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	M.V José Felipe Orellana Mejía
Correo Electrónico:	despachosuperiormaga@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL**Datos del Programa/Proyecto:**

Código del sistema:	SIGEACI49
Nombre del Programa/Proyecto:	PRODENORTE
No. de Donación:	1070-GT
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	29-2011
Fuente Cooperante:	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Dirección Física del Proyecto:	1a. calle 13-04 zona 3 Cobán Alta Verapaz
Teléfono directo del Proyecto:	79510456
Institución Ejecutora:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora:	7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:**Objetivo General:**

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales en condiciones de pobreza, de la región norte de la República de Guatemala, mediante el incremento de oportunidades de generación de ingresos y empleos de los usuarios a través de la vinculación a cadenas productivas y mayor acceso a mercados.

Objetivo(s) Específico(s):

- Desarrollar las capacidades humanas y sociales, mediante la formación humana/técnica y el fortalecimiento a las municipalidades para la adquisición de capacidades de planificación y promoción del desarrollo local
- Incrementar la producción, ingresos y empleo de los usuarios por medio de prestación de servicios técnicos de apoyo a la producción y comercialización.
- Creación y consolidación de unidades productivas y de transformación a partir de la demanda de mercado, por medio de encadenamientos empresariales y alianzas público privadas que faciliten el agregado al valor, la comercialización, el acceso a mercados y los servicios financieros.
- Creación de condiciones y oportunidades para las mujeres y jóvenes indígenas rurales, para el desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles, con un enfoque de mercado.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	13/12/2011
Fecha de inicio:	27/1/2012
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	27/1/2012
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/9/2018
Fecha de finalización original:	27/1/2018
Fecha de finalización vigente:	30/9/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
01	28/12/2017	28/12/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 27/1/2018 POR 30/3/2018 Y EJECUCIÓN: 27/7/2017 POR 30/3/2018
1	28/3/2018	10/9/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/3/2018 POR 30/9/2018

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

111361207

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	381,818.00	7.69000	2,936,180.42
Total:		381,818.00		2,936,180.42
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		831,818.00		6,396,680.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.69000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
Total:		450,000.00		3,460,500.00
Monto Total		450,000.00		3,460,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aca	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	7500
Rural	Indígena	Masculino	16-49	12500

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
-------	-------------------	----------------	----------------------------

10/8/2015	0.00	7.63900	0.00
12/11/2015	0.00	0.00000	0.00
9/5/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
2/9/2016	0.00	7.69000	0.00
2/9/2016	0.00	0.00000	0.00
2/11/2016	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
1/3/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
24/4/2017	-450,000.00	7.69000	-3,460,500.00
7/9/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
18/10/2017	450,000.00	7.69000	3,460,500.00
7/3/2018	0.00	0.00000	0.00
4/5/2018	0.00	0.00000	0.00
10/9/2018	0.00	0.00000	0.00
Total:	900,000.00		6,921,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	427,500.00	12.35%
Total	3,460,500.00	0.00	3,460,500.00	427,500.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - acceso a mercados	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	427,500.00	14.56%
Total	2,936,180.42	0.00	2,936,180.42	427,500.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Febrero	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Marzo	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Abril	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Julio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Agosto	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Septiembre	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Octubre	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	450,000.00	625,000.00	625,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	450,000.00	625,000.00	625,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - acceso a mercados	0 %	13.09 %
Total:	0.00	13.09

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
1420 - QUICHE - IXCAN	0.00	0.00
1502 - BAJA VERAPAZ - SAN MIGUEL CHICAJ	0.00	51,486.15

1503 - BAJA VERAPAZ - RABINAL	0.00	0.00
1504 - BAJA VERAPAZ - CUBULCO	0.00	20,000.00
1508 - BAJA VERAPAZ - PURULHA	0.00	51,676.32
1601 - ALTA VERAPAZ - COBAN	0.00	48,086.90
1605 - ALTA VERAPAZ - TAMAHU	0.00	13,639.80
1606 - ALTA VERAPAZ - TUCURU	0.00	0.00
1607 - ALTA VERAPAZ - PANZOS	0.00	0.00
1608 - ALTA VERAPAZ - SENAHU	0.00	0.00
1609 - ALTA VERAPAZ - SAN PEDRO CARCHA	0.00	0.00
1610 - ALTA VERAPAZ - SAN JUAN CHAMELCO	0.00	43,790.93
1611 - ALTA VERAPAZ - LANQUIN	0.00	38,047.86
1612 - ALTA VERAPAZ - CAHABON	0.00	127,031.49
1613 - ALTA VERAPAZ - CHISEC	0.00	33,740.55
1614 - ALTA VERAPAZ - CHAHAL	0.00	0.00
1615 - ALTA VERAPAZ - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00
1616 - ALTA VERAPAZ - SANTA CATALINA LA TINTA	0.00	0.00
1617 - ALTA VERAPAZ - RAXRUHA	0.00	0.00
Total	0.00	427,500.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
13.37 %	13.09 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas	Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas
Ejecución Financiera Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas	Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas
Ejecución presupuestaria Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas	Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas
Ejecución física Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas	Existe un re acomodamiento presupuestario para ejecutar los proyectos según su ubicación geográfica. Las modificaciones se encuentran en proceso de ser aprobadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA

Documento:	Ref. Oficio No. DCPF-1671-2018/hv	No. de Referencia:	72317
Usuario que envía:	Olga Marina Requena Alvarez	Ubicación de Origen:	Administración Financiera
Usuario que recibe:	Hulda Priscila Castellanos	Ubicación de Entrega:	Presupuesto
Fecha de recepción:	21/11/2018 2:05 p.m.	Folios:	35
Asunto:	Se envía el "Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF" e "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero", correspondientes al bimestre Septiembre-Octubre 2018.		
Trasladar A: <input type="checkbox"/> Blanca Morayma Castaneda Vargas <input type="checkbox"/> Christian Fernando Rodas Flores <input checked="" type="checkbox"/> Hulda Priscila Castellanos <input type="checkbox"/> Juan Esteban Ordonez Gonzalez <input type="checkbox"/> Luis Leonel Villeda Hurtarte <input type="checkbox"/> Maria Luisa Hernandez Giron <input type="checkbox"/> Melvin Ivan Polanco Donado <input type="checkbox"/> Selvin Arnoldo Merida <input type="checkbox"/> Sergio Anibal Molina Rosales Detalle de traslados:		Propósito: <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Atender lo solicitado <input type="checkbox"/> Emita Opinión <input type="checkbox"/> Informe sobre el particular <input type="checkbox"/> No procede lo solicitado <input type="checkbox"/> Otros: _____ <input type="checkbox"/> Para su estudio y dictamen <input type="checkbox"/> Procédase como se solicita <input type="checkbox"/> Responder <input type="checkbox"/> Su conocimiento y Efectos	
Observaciones:		<div>Selvin Arnoldo Mérida G. F. JEFE DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MAGA</div> <div>Firma y Sello</div>	
